N1 IT | Grupo Stefanini

Grupo Stefanini · Documento corporativo

Relatório interno de validação

Análise do documento As Is e do fluxograma do Thanos

Documento analisado	Documento As Is – Gestão e Medição de Serviços (SLA) – SIGMES, versão 1.0, outubro de 2026 (10 páginas)
Base do levantamento	Reuniões de 29 e 30/09/2026; key user: Eduardo Dalben Pozze
Finalidade	Alinhamento da equipe Stefanini. Não enviar ao Itaú.
Data da análise	28/10/2026
Projeto	Substituição do Thanos – conclusão prevista em 29/01/2027

Confidencial | Uso interno Stefanini

1. Parecer geral

Objetivo: dar à equipe uma visão rápida da qualidade do As Is e dos riscos de construir o novo sistema sobre ele.

Conclusão: o As Is é bom como levantamento de dores e regras (23 regras de negócio e 24 pendências já listadas), mas **ainda não está validado**. Dá para desenhar o fluxo novo, desde que as decisões abertas sejam confirmadas pelo Itaú até 19/11/2026. Construir antes disso traz risco alto de retrabalho.

Critério	Avaliação	Resumo
Completo	Parcial	Faltam volumes, tabela de pontuação, matriz de classificação, lista de status, campos da ocorrência, layout do e-mail e inventário de integrações.
Coerente	Parcial	Há divergências entre o texto (pág. 4–5) e a figura (pág. 6), e sobre quem encerra a ocorrência.
Atualizado	Sim, com ressalva	É de outubro/2026 e retrata o processo demonstrado, mas o próprio documento diz que não foi validado (pág. 8 e 10).
Pronto para desenhar o To Be	Condicional	Depende das decisões V3, V9, V16, V17 e V18 (seção 4).

Os 5 pontos mais urgentes

1. **O que é o Thanos?** O As Is chama o sistema de SIGMES “hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1) e nunca cita o Power Automate. A figura (pág. 6) usa “Sistema Signes/Thanos”. Confirmar a arquitetura real antes de planejar a migração.
2. **Quem encerra a ocorrência?** O texto diz que é o responsável interno (pág. 5, etapa 13 e RN-13). A figura mostra o fornecedor “atualizando/finalizando” (pág. 6).
3. **Regra de pontuação ausente.** Não há pesos, faixas nem exemplos (RN-17, RN-18; PV-17).
4. **Status e classificação sem lista.** “Finalizada”, “aberta indevidamente”, “leve a gravíssima” e “status do plano de ação” não estão definidos (RN-06, RN-16; PV-03, PV-09).
5. **Competência da medição.** Corte, competência e reabertura não existem (PV-16).

Como ler a numeração de página: as páginas citadas são as do PDF (1 a 10). O PDF não tem número impresso nas páginas.

2. Validação do documento atual: achados

Objetivo: listar lacunas, inconsistências, regras ambíguas e pontos que dependem de confirmação, com a página de cada trecho. **Severidade:** A = alta (bloqueia o desenho ou o prazo), M = média, B = baixa.

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-01	Inconsistência	1, 4, 6	“SIGMES, hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1); raia “Sistema Signes/Thanos” (pág. 6); “índices de banco” (pág. 4); “robô” (pág. 7)	O PDF nunca cita o Power Automate. Os termos Thanos, SIGMES e “Signes” aparecem como se fossem a mesma coisa. Descreve um sistema com banco de dados, logs e módulos, não só um fluxo.	Confirmar o que existe hoje: plataforma, banco, onde roda o robô de e-mail, quem o mantém. Padronizar o nome.	A
I-02	Inconsistência	5, 6	Etapa 13: “Responsável interno… encerrar a ocorrência” (pág. 5); RN-13 (pág. 7). Figura: fornecedor “Atualizar/finalizar ocorrência” (pág. 6)	Texto e figura discordam sobre quem finaliza. O papel do fornecedor diz só “recebimento por e-mail” (pág. 2).	Definir se o fornecedor acessa o sistema. Assumimos que não (V5).	A
I-03	Inconsistência	6	Figura: seta tracejada de “Notificar via e-mail” (fornecedor) para “Extrair relatório mensal” (Gestão de Serviços)	A figura liga a resposta do fornecedor ao início da extração mensal. No texto (etapa 14, pág. 5) a extração é mensal e feita pela Gestão. Falta um evento de início por tempo.	Corrigir no To Be: início mensal por data de corte (passo 19).	M
I-04	Inconsistência	5, 6	Etapas 5 e 8 (pág. 5) x raias da figura (pág. 6)	Na figura, “Classificar SLA e preencher observação” e “Notificar fornecedor por e-mail” (manual) estão na raia do Sistema. O texto os atribui ao Usuário.	Padronizar raias no To Be.	M
I-05	Inconsistência	5, 6, 8, 9	Etapa 16–17 (pág. 5): inclui “ajuste operacional”; RN-18 (pág. 8); PV-19 cita “perda de postos” (pág. 10). Figura: 4 saídas, sem “ajuste operacional” e com “Escalonamento/Rescisão” juntos	O gateway “O resultado exige ação?” não existe na figura. Há um gateway sem rótulo (“Ação com Fornecedor”). Os conjuntos de ações dos três trechos não coincidem.	Fechar a lista de ações com o Itaú (V20).	M
I-06	Lacuna	4, 6	Seção 4.1, fluxo de acesso (pág. 4)	O fluxo de acesso está no texto, mas não na figura. Aparece o “ponto focal”, que não está nos papéis (pág. 2). Quando recusado, não há aviso ao solicitante. Revisão e revogação de acesso não existem (PV-10).	Incluir fase de acesso no To Be (passos 1–3).	M
I-07	Inconsistência	4–5, 8	Etapa 3–4 (pág. 4); RN-20 “itens inativos deixam de aparecer” (pág. 8)	Se itens inativos não aparecem na lista, a pessoa não “seleciona” o item para depois descobrir que está inativo. A lógica da decisão (etapa 4) não bate com RN-20.	No To Be, o sistema só lista itens ativos e oferece “pedir cadastro” (passos 6–7).	B

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-08	Ambiguidade	7	RN-05: “Evita que um fornecedor classifique diretamente ocorrência contra outro fornecedor” (pág. 7)	A frase supõe que fornecedores registram ocorrências. Os papéis dizem que fornecedor só recebe e trata (pág. 2).	Confirmar se algum fornecedor acessa o sistema (V5).	M
I-09	Lacuna	5, 7	Etapa 5: “classificação de SLA, status do plano de ação” (pág. 5); RN-06 (pág. 7)	Os valores de classificação (leve, moderada, grave, gravíssima) e de “status do plano de ação” dependem de um “de-para” que não está no documento.	Obter a matriz completa (V9; PV-09).	A
I-10	Lacuna	7, 8	RN-13, RN-15, RN-16 (pág. 7); PV-03 (pág. 8)	“Status final”, “finalizada” e “aberta indevidamente” são usados sem lista de status. Não se sabe se “indevida” é um tipo de “finalizada”.	Obter a lista e o efeito de cada status (V3).	A
I-11	Inconsistência	3, 4, 7	Oportunidade “Gestão de pendências”: “Independente das pendencias resolvidas ou não, ter as pontuações validas com o histórico” (pág. 3). RN-15: só finalizadas entram (pág. 7)	A frase da pág. 3 parece fora de contexto, contém erro de digitação e contradiz RN-15 se for lida ao pé da letra (pontuar mesmo aberta).	Confirmar a intenção. Assumimos RN-15 e lista de abertas no fechamento (V18).	A
I-12	Ambiguidade	7	RN-11 e RN-16 (pág. 7); PV-08 (pág. 9)	“Solicitar desconsideração quando aplicável”: a quem, como e em que prazo? Não se diz se a ocorrência “indevida” entra na medição.	Definir o procedimento (V8).	M
I-13	Lacuna	5, 7, 9	Etapa 14 “Mensalmente” (pág. 5); RN-15 (pág. 7); PV-16 (pág. 9)	Sem data de corte, regra de competência, reabertura ou tratamento de ocorrência encerrada após o corte. Fato em um mês e encerramento em outro: qual mês pontua?	Definir com o Itaú (V16).	A
I-14	Lacuna	8, 9	RN-17, RN-18 (pág. 8); PV-17 (pág. 9)	Não há tabela de pontuação, pesos, faixas, vigência nem exemplo de cálculo. A ação de gestão depende de “faixas contratuais vigentes”.	Obter a tabela por contrato (V17).	A
I-15	Lacuna	3–5	Dor 2 “vários minutos” (pág. 3); “Dor 1”; oportunidades de desempenho (pág. 4)	Não há números: ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos, itens, tamanho do histórico, tempo real das telas, taxa de falha de e-mail. Sem isso não dá para fixar metas de desempenho e capacidade.	Pedir os volumes ao Itaú e medir o Thanos.	A
I-16	Lacuna	4, 7, 9	“Base única e integrações” (pág. 4); RN-02, RN-03 (pág. 6); PV-13 (pág. 9)	Não há inventário de sistemas: e-mail (qual serviço), login, fonte do RGI, cadastro de fornecedores, Teams, relatórios.	Levantar com a arquitetura do Itaú (V13, V26).	A

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-17	Lacuna	6, 7	RN-02 “carga horária” (pág. 6); RN-03 (pág. 6)	A hierarquia polo, prédio, torre, andar, posto e local e o papel da “carga horária” não estão explicados.	Pedir modelo de dados e exemplos reais.	M
I-18	Lacuna	7	RN-09, RN-10 (pág. 7)	Não há modelo do e-mail, lista de campos da ocorrência, nem como se tratam anexos e evidências (que aparecem em RN-05 e na Dor 5).	Pedir o e-mail atual e o formulário de ocorrência.	M
I-19	Lacuna (compliance)	3, 10	Dor 8 “Dados pessoais e documentos ficam nas observações” (pág. 3); PV-12 (pág. 10)	Risco de LGPD. Não há regra sobre quais dados, quem vê e por quanto tempo.	Envolver Privacidade/Jurídico do Itaú (V12, V21).	A
I-20	Lacuna	6–8	Nenhum trecho	Não há fluxo para o fornecedor contestar uma ocorrência, nem para a ausência de resposta, e-mail inválido, ocorrência duplicada ou ausência do responsável.	Incluímos contestação no To Be (V31). Confirmar se o processo existe.	A
I-21	Ambiguidade	3	Dor 1: “pode não apresentar erro e ainda assim não entregar o e-mail” (pág. 3)	A causa da falha não foi investigada (robô, serviço de e-mail, antispam). Sem causa, o novo sistema pode repetir o problema.	Pedir logs e um caso real de falha.	A
I-22	Ambiguidade	3	Dor 4: “não há lembretes efetivos” (pág. 3)	Não se sabe se existem lembretes que não funcionam ou se não existem.	Confirmar o que existe hoje.	B
I-23	Dependência	7, 8	RN-14 (pág. 7); RN-20 (pág. 8); PV-11	Permissões amplas “criadas para investigação” e regras de inativação cujo efeito sobre ocorrências abertas não está definido.	Definir segregação de funções (V11) e efeito da inativação (V14).	M
I-24	Lacuna	2, 8–9	Papéis (pág. 2); PV-10, PV-14 (pág. 9)	“Administrador do SIGMES” e “Gestão de Acessos” aparecem nas pendências, mas não nos papéis. “Responsável interno” (etapas 10–13) não é papel definido.	Fechar a lista de papéis (V1, V11).	M
I-25	Inconsistência	2, 3–4	Escopo “Redesenho To Be… fora” (pág. 2); seção 3 e “hub” (págs. 3–4, 10)	A seção 3 já propõe solução. O termo “hub” (“métricas dentro do hub”, “novo hub”) não é definido. A seção 3 não liga cada oportunidade a uma dor. Quase tudo é “Alta”.	Usar a seção 3 só como insumo. Definir “hub”.	B
I-26	Dependência	8, 10	RN-23 (pág. 8); PV-22 (pág. 10)	Módulo de atendimento técnico “construído, mas não usado”, com “sistema próprio do fornecedor” sem identificação.	Confirmar como fora de escopo (V23).	B

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-27	Dependência	10	Roteiro (pág. 10); Fontes (pág. 10); PV-24	Só duas gravações de reunião e nenhuma amostra real. O fluxo nunca foi testado com casos reais. O key user é uma só pessoa.	Planejar homologação com amostra real (V25).	A
I-28	Forma	1, 4, 10	Capa e rodapés (págs. 1–10); etapa 2 “7.” (pág. 4); roteiro “8–12” (pág. 10)	Sem histórico de versões, aprovadores ou data de validação. A numeração continua erradamente entre listas. PDF sem número de página.	Corrigir se o As Is for reenviado.	B
I-29	Dependência	2–3, 9–10	Dor 15 (pág. 3); PV-21 (pág. 10)	Não se sabe quem mantém o Thanos hoje nem quem será o dono do novo produto. Impacta migração e desligamento.	Confirmar o dono e a equipe de suporte (V22).	M
I-30	Dependência	8–9	RN-19, PV-15 (págs. 8–9)	A carga em lote “existe, mas não é confiável”. Não se sabe se entra no escopo nem qual é o formato.	Definir escopo (V15).	M
I-31	Lacuna	—	Nenhum trecho	Não há dados para migração: quanto histórico, formato, qualidade, ocorrências abertas e regra de desligamento do Thanos.	Definir com o Itaú (V29, V30).	A

2.1 Resumo dos achados

Severidade	Quantidade
Alta	14
Média	12
Baixa	5
Total	31

2.2 Pendências do As Is (PV-01 a PV-24) e como serão tratadas

O As Is lista 24 pendências (págs. 8–10). Quase todas viram ponto para validação do Itaú no documento enviado ao cliente.

Pontos novos que a Stefanini acrescentou (V26 a V31): login e e-mail, hospedagem, papel da Stefanini, migração do histórico, desligamento do Thanos e contestação.

Pendência do As Is	Tema	Ponto para validação no documento do Itaú
PV-01	Responsável pelo acompanhamento	V1
PV-02	Critério de encerramento	V2
PV-03	Status e efeitos	V3, V18
PV-04	Prazo para encerramento	V4
PV-05	Retorno do fornecedor	V5
PV-06	Confirmação de entrega do e-mail	V6
PV-07	Lista de destinatários	V7
PV-08	Procedimento de correção	V8
PV-09	Matriz de classificação	V9
PV-10	Critérios de acesso	V10
PV-11	Segregação de funções	V11
PV-12	Dados pessoais	V12
PV-13	Cadastro mestre e fonte oficial	V13
PV-14	Governança cadastral	V14
PV-15	Carga em lote	V15
PV-16	Periodicidade e corte	V16
PV-17	Tabela de pontuação	V17
PV-18	Indicadores normalizados	V19
PV-19	Aprovação das ações de gestão	V20
PV-20	Retenção e histórico	V21
PV-21	Sustentação	V22

Pendência do As Is	Tema	Ponto para validação no documento do Itaú
PV-22	Escopo do atendimento técnico	V23
PV-23	Timeout e segurança	V24
PV-24	Amostra de validação	V25

3. Análise do fluxograma original

Objetivo: avaliar etapas, decisões, integrações, entradas e saídas e tratamento de exceções do fluxo atual e apontar o que o novo sistema deve resolver.

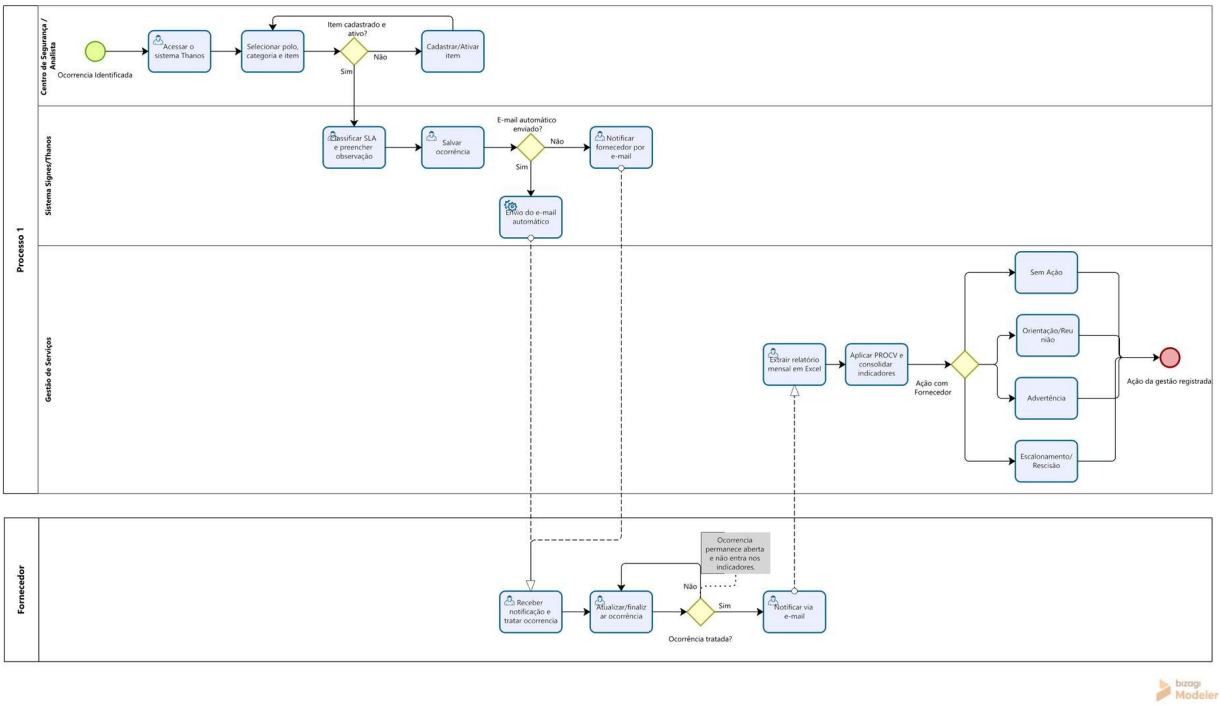


Figura 1 – Fluxograma As Is (pág. 6 do documento original).

3.1 O que o fluxograma contém

Elemento	Quantidade e descrição
Piscinas e raias	2 piscinas: Processo 1 (raias Centro de Segurança/Analista, Sistema Signes/Thanos, Gestão de Serviços) e Fornecedor.
Eventos	1 de início (“Ocorrência identificada”) e 1 de fim (“Ação da gestão registrada”). Não há evento de início mensal.
Atividades	16: acessar o sistema, selecionar polo/categoria/item, cadastrar/ativar item, classificar SLA, salvar, enviar e-mail automático, notificar por e-mail (manual), receber e tratar, atualizar/finalizar, notificar via e-mail, extrair relatório, aplicar PROCV, e 4 ações de gestão.
Decisões	4: item cadastrado e ativo; e-mail enviado; ocorrência tratada; ação com fornecedor (sem rótulo claro).
Entradas e saídas	Entrada: fato observado. Saída: ação de gestão registrada. As entradas e saídas de cada etapa não aparecem na figura. Estão só no texto (págs. 4–5).
Integrações	Só duas: e-mail automático e Excel (manual). Cadastro mestre e log existem no texto, mas não na figura.
Exceções tratadas	3: item inativo, falha de e-mail e ocorrência não tratada (fica aberta).

3.2 Divergências entre figura e texto

Ver achados I-02 a I-06 da seção 2. Resumo: quem finaliza, raias de duas atividades, seta do fornecedor para o relatório, gateway de ação sem rótulo e fluxo de acesso ausente.

3.3 Gargalos

- **Notificação:** quando o e-mail falha, tudo para até alguém avisar manualmente, e não há prova de entrega.
- **Cadastro de item:** sem item ativo não se abre a ocorrência. Depende do Analista ou do Gestor, sem prazo.
- **Fornecedor sem prazo:** o laço “ocorrência tratada? Não” não tem limite de tempo nem lembrete.
- **Fechamento mensal:** depende de extração, PROCV e tabela dinâmica feitas à mão.
- **Desempenho:** telas e consultas levam minutos (Dor 2, pág. 3).
- **Abertura individual:** documentos de terceiros são registrados um a um (Dor 9).

3.4 Redundâncias

- Notificação automática e manual, com controle paralelo.
- Dados digitados no sistema e de novo em Excel, e-mail e filas próprias (Dor 14).
- Correção de fornecedor por encerramento e nova abertura (RN-11).
- Cadastros em vários lugares com padronização manual (Dor 11).
- Extração e consolidação mensal que o sistema poderia calcular.

3.5 Etapas manuais

Etapa	Manual hoje	No novo fluxo
Notificação em caso de falha (etapa 8)	Sim	Reenvio automático e alerta (passos 11–12)
Controle paralelo de notificações	Sim (planilha e e-mail)	Status dentro do sistema
Extração mensal (etapa 14)	Sim	Fechamento automático (passo 19)
PROCV e tabela dinâmica (etapa 15)	Sim	Cálculo automático (passo 20)
Correção de fornecedor	Sim (encerrar e abrir outra)	Correção com reenvio (passo 16)
Lembrete de pendência	Não existe efetivo	Lembretes automáticos (passo 14)
Cadastro e carga em lote	Parcialmente manual	Carga assistida (passo 7)

3.6 Exceções que o fluxo atual não cobre

- Dado errado na ocorrência (além de fornecedor).
- Contestação do fornecedor.
- Fornecedor que não responde.
- E-mail inválido ou sem destinatário.
- Responsável ausente.
- Sessão expirada no meio do preenchimento (Dor 12).
- Ocorrência aberta no dia do corte e encerrada depois.
- Reabertura de ocorrência finalizada.

- Ocorrência duplicada.
- Recusa de acesso comunicada ao solicitante.

3.7 Limitações da plataforma atual que o novo sistema deve resolver

> **Atenção**
> A tabela abaixo mistura evidências do As Is com limitações **conhecidas do Power Automate**, que usamos como hipótese porque o PDF não confirma a plataforma (achado I-01). Validar com a equipe que mantém o Thanos antes de usar em reunião.

Limitação	Evidência no As Is ou hipótese	Como o novo sistema responde
Falha silenciosa de fluxos e de e-mail	Dor 1 (pág. 3). Hipótese: fluxo falha sem alerta e envia por conta ou conector sujeito a limites.	Fila de notificações com status, tentativas e alertas; remetente corporativo.
Dependência de conexão de uma pessoa	Hipótese: conexões em nome de um usuário expiram e quebram o fluxo.	Conta de serviço e monitoramento.
Histórico de execução curto	Hipótese: o histórico de execuções fica poucos dias. Dificulta investigar o que aconteceu.	Auditoria própria e retenção definida pelo Itaú.
Consultas e filtros lentos	Dores 2 e 3 (pág. 3). Hipótese: limites de listas e de consulta.	Banco de dados com índices, paginação e filtros.
Regras de cálculo difíceis de manter	Dor 13 (pág. 3). Pontuação em Excel.	Pontuação parametrizada por contrato e vigência.
Sessão e rascunho	Dor 12; RN-21 (págs. 3, 8).	Aviso, renovação e rascunho automático.
Sem dono e sem evolução	Dor 15; PV-21 (págs. 3, 10).	Sustentação com dono, canal e prazos.
Dados pessoais em campo livre	Dor 8; PV-12.	Campos próprios, mínimos e protegidos.

3.8 Dores do As Is e como o novo fluxo as resolve

Dor (pág. 3)	Resposta no novo fluxo	Passos
1 Instabilidade no e-mail	Status, reenvio automático e alerta	10 a 12
2 e 3 Lentidão e filtros	Filtros completos e paginação (requisito)	Todos
4 Abertas fora dos indicadores	Lembretes, painel e lista de abertas no fechamento	14, 17, 19, 21
5 Encerramento sem justificativa	Motivo e evidência obrigatórios	18
6 Permissões amplas	Edição e encerramento pelo responsável; exceções justificadas	14 a 18
7 Correção não reenvia	Reenvio controlado e aviso de desconsideração	15, 16
8 e 9 Terceiros, abertura individual	Fora da entrega base; a confirmar (V12)	—
10 e 11 Carga em lote e cadastros	Carga assistida e listas controladas (V15)	6, 7
12 Timeout	Aviso e rascunho	5, 8

Dor (pág. 3)	Resposta no novo fluxo	Passos
13 Medição fora do sistema	Cálculo automático	19, 20
14 Controles paralelos	Tudo no sistema	10 a 24
15 Sem sustentação	Sustentação Stefanini (V22)	12

4. Decisões de desenho adotadas e riscos para o time

Objetivo: registrar as hipóteses que usamos no novo fluxo e que podem mudar com a resposta do Itaú.

Decisão adotada	Por quê	Se o Itaú discordar
O fornecedor não acessa o sistema; responde por e-mail	O As Is diz “recebimento por e-mail” (pág. 2)	Criar acesso ou link seguro para o fornecedor (V5). Aumenta o escopo.
Só ocorrências finalizadas pontuam	RN-15 (pág. 7)	Se abertas pontuarem, muda o passo 19 e o cálculo.
Competência = mês do encerramento	Sem regra no As Is; é o critério mais simples	Mudar o passo 19 (V16).
3 tentativas de reenvio (5, 15 e 60 minutos)	Proposta nossa	Ajustar parâmetros (V6).
Papel da Stefanini: sustentação e investigação de falhas de envio	Proposta nossa	Rever custos e equipe (V28).
Go-live em 21/01 e desligamento em 29/01	A data de 29/01 não diz se é go-live ou desligamento	Se for go-live, não há convivência; se for desligamento, o prazo é muito apertado (V30).
Módulo de terceiros, indicadores avançados e carga em lote ficam condicionados ao prazo	Média prioridade no As Is (pág. 4); prazo de 13 semanas	Se o Itaú exigir, replanejar ou reduzir outro escopo.

Riscos de prazo

Restam cerca de 13 semanas até 29/01/2027, com recesso de fim de ano no meio.

O primeiro fechamento mensal real no novo sistema ocorre depois do desligamento. Propusemos recalcular dezembro em paralelo.

Sem as respostas do Itaú até 19/11/2026, o congelamento do escopo em 30/11 fica em risco.

5. Dúvidas a esclarecer com o Itaú

Objetivo: reunir as perguntas que precisam de resposta antes de concluir a documentação. Estão em ordem de prioridade.

1. **Plataforma e nomes:** o Thanos é o SIGMES? Roda em Power Automate, em banco próprio ou em outra plataforma? Quem o mantém? (I-01)
2. **Quem encerra a ocorrência:** o responsável interno ou o fornecedor? O fornecedor acessa o sistema? (I-02, V5)
3. **Pontuação:** podemos receber a tabela vigente de cada contrato, com um exemplo de cálculo real? (V17)

4. **Status e classificação:** qual a lista completa de status e a matriz de severidade? (V3, V9)
5. **Medição:** qual a data de corte e a regra de competência? Ocorrências abertas pontuam? (V16, V18)
6. **Prazo final:** 29/01/2027 é entrada em produção ou desligamento do Thanos? (V30)
7. **Volumes:** quantas ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos e itens, e qual o tamanho do histórico? (I-15)
8. **Integrações:** qual o serviço de login, o serviço de e-mail e a fonte oficial de RGI, polos e fornecedores? (V13, V26)
9. **E-mail:** qual a causa conhecida das falhas e qual o modelo do e-mail atual? (I-21, I-18)
10. **Dados pessoais:** quais dados de terceiros podem ser registrados e por quanto tempo? Privacidade já foi envolvida? (V12, V21)
11. **Contestação e exceções:** existe processo quando o fornecedor discorda ou não responde? (V31)
12. **Amostra real:** quais três ocorrências reais usaremos para validar o fluxo? (V25)
13. **Pessoas:** quem valida pelo Itaú além do key user e quem substitui no recesso? (R9, R10)
14. **Escopo:** módulo de terceiros, carga em lote e indicadores avançados entram nesta entrega? (V12, V15, V19)
15. **Migração:** quanto histórico migrar e o que fazer com ocorrências abertas no corte? (V29)
16. **Hospedagem e segurança:** onde o sistema será hospedado e quais políticas do Itaú se aplicam? (V27)

Próximos passos

- Alinhar este relatório com a equipe e fechar as dúvidas 1 a 6 em reunião rápida com o key user.
- Revisar e enviar ao Itaú a documentação do novo sistema (arquivo separado).
- Receber as respostas até 19/11/2026 e atualizar o fluxo e os passos.
- Registrar o resultado das validações e congelar o escopo em 30/11/2026.
