N1 IT | Grupo Stefanini

Grupo Stefanini · Documento corporativo

Relatório interno de validação

Análise do documento As Is e do fluxograma do Thanos

Documento analisado	Documento As Is – Gestão e Medição de Serviços (SLA) – SIGMES, versão 1.0, outubro de 2026 (10 páginas)
Base do levantamento	Reuniões de 29 e 30/09/2026; key user: Eduardo Dalben Pozze
Finalidade	Alinhamento da equipe Stefanini. Não enviar ao Itaú.
Data da análise	28/10/2026
Projeto	Substituição do Thanos – conclusão prevista em 29/01/2027

Confidencial | Uso interno Stefanini

1. Parecer geral

Objetivo: dar à equipe uma visão rápida da qualidade do As Is e dos riscos de construir o novo sistema sobre ele.

Conclusão: o As Is é bom como levantamento de dores e regras (23 regras de negócio e 24 pendências já listadas), mas **ainda não está validado**. Dá para desenhar o fluxo novo, desde que as decisões abertas sejam confirmadas pelo Itaú até 19/11/2026. Construir antes disso traz risco alto de retrabalho.

Critério	Avaliação	Resumo
Completo	Parcial	Faltam volumes, tabela de pontuação, matriz de classificação, lista de status, campos da ocorrência, layout do e-mail e inventário de integrações.
Coerente	Parcial	Há divergências entre o texto (pág. 4–5) e a figura (pág. 6), e sobre quem encerra a ocorrência.
Atualizado	Sim, com ressalva	É de outubro/2026 e retrata o processo demonstrado, mas o próprio documento diz que não foi validado (pág. 8 e 10).
Pronto para desenhar o To Be	Condicional	Depende das decisões V3, V9, V16, V17 e V18 (seção 4).

Os 5 pontos mais urgentes

1. **O que é o Thanos?** O As Is chama o sistema de SIGMES “hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1) e nunca cita o Power Automate. A figura (pág. 6) usa “Sistema Signes/Thanos”. Confirmar a arquitetura real antes de planejar a migração.
2. **Quem encerra a ocorrência?** O texto diz que é o responsável interno (pág. 5, etapa 13 e RN-13). A figura mostra o fornecedor “atualizando/finalizando” (pág. 6).
3. **Regra de pontuação ausente.** Não há pesos, faixas nem exemplos (RN-17, RN-18; PV-17).
4. **Status e classificação sem lista.** “Finalizada”, “aberta indevidamente”, “leve a gravíssima” e “status do plano de ação” não estão definidos (RN-06, RN-16; PV-03, PV-09).
5. **Competência da medição.** Corte, competência e reabertura não existem (PV-16).

Como ler a numeração de página: as páginas citadas são as do PDF (1 a 10). O PDF não tem número impresso nas páginas.

2. Validação do documento atual: achados

Objetivo: listar lacunas, inconsistências, regras ambíguas e pontos que dependem de confirmação, com a página de cada trecho. **Severidade:** A = alta (bloqueia o desenho ou o prazo), M = média, B = baixa.

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-01	Inconsistência	1, 4, 6	“SIGMES, hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1); raia “Sistema Signes/Thanos” (pág. 6); “índices de banco” (pág. 4); “robô” (pág. 7)	O PDF nunca cita o Power Automate. Os termos Thanos, SIGMES e “Signes” aparecem como se fossem a mesma coisa. Descreve um sistema com banco de dados, logs e módulos, não só um fluxo.	Confirmar o que existe hoje: plataforma, banco, onde roda o robô de e-mail, quem o mantém. Padronizar o nome.	A
I-02	Inconsistência	5, 6	Etapa 13: “Responsável interno… encerrar a ocorrência” (pág. 5); RN-13 (pág. 7). Figura: fornecedor “Atualizar/finalizar ocorrência” (pág. 6)	Texto e figura discordam sobre quem finaliza. O papel do fornecedor diz só “recebimento por e-mail” (pág. 2).	Definir se o fornecedor acessa o sistema. Assumimos que não (V5).	A
I-03	Inconsistência	6	Figura: seta tracejada de “Notificar via e-mail” (fornecedor) para “Extrair relatório mensal” (Gestão de Serviços)	A figura liga a resposta do fornecedor ao início da extração mensal. No texto (etapa 14, pág. 5) a extração é mensal e feita pela Gestão. Falta um evento de início por tempo.	Corrigir no To Be: início mensal por data de corte (passo 19).	M
I-04	Inconsistência	5, 6	Etapas 5 e 8 (pág. 5) x raias da figura (pág. 6)	Na figura, “Classificar SLA e preencher observação” e “Notificar fornecedor por e-mail” (manual) estão na raia do Sistema. O texto os atribui ao Usuário.	Padronizar raias no To Be.	M
I-05	Inconsistência	5, 6, 8, 9	Etapa 16–17 (pág. 5): inclui “ajuste operacional”; RN-18 (pág. 8); PV-19 cita “perda de postos” (pág. 10). Figura: 4 saídas, sem “ajuste operacional” e com “Escalonamento/Rescisão” juntos	O gateway “O resultado exige ação?” não existe na figura. Há um gateway sem rótulo (“Ação com Fornecedor”). Os conjuntos de ações dos três trechos não coincidem.	Fechar a lista de ações com o Itaú (V20).	M
I-06	Lacuna	4, 6	Seção 4.1, fluxo de acesso (pág. 4)	O fluxo de acesso está no texto, mas não na figura. Aparece o “ponto focal”, que não está nos papéis (pág. 2). Quando recusado, não há aviso ao solicitante. Revisão e revogação de acesso não existem (PV-10).	Incluir fase de acesso no To Be (passos 1–3).	M
I-07	Inconsistência	4–5, 8	Etapa 3–4 (pág. 4); RN-20 “itens inativos deixam de aparecer” (pág. 8)	Se itens inativos não aparecem na lista, a pessoa não “seleciona” o item para depois descobrir que está inativo. A lógica da decisão (etapa 4) não bate com RN-20.	No To Be, o sistema só lista itens ativos e oferece “pedir cadastro” (passos 6–7).	B

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-08	Ambiguidade	7	RN-05: “Evita que um fornecedor classifique diretamente ocorrência contra outro fornecedor” (pág. 7)	A frase supõe que fornecedores registram ocorrências. Os papéis dizem que fornecedor só recebe e trata (pág. 2).	Confirmar se algum fornecedor acessa o sistema (V5).	M
I-09	Lacuna	5, 7	Etapa 5: “classificação de SLA, status do plano de ação” (pág. 5); RN-06 (pág. 7)	Os valores de classificação (leve, moderada, grave, gravíssima) e de “status do plano de ação” dependem de um “de-para” que não está no documento.	Obter a matriz completa (V9; PV-09).	A
I-10	Lacuna	7, 8	RN-13, RN-15, RN-16 (pág. 7); PV-03 (pág. 8)	“Status final”, “finalizada” e “aberta indevidamente” são usados sem lista de status. Não se sabe se “indevida” é um tipo de “finalizada”.	Obter a lista e o efeito de cada status (V3).	A
I-11	Inconsistência	3, 4, 7	Oportunidade “Gestão de pendências”: “Independente das pendencias resolvidas ou não, ter as pontuações validas com o histórico” (pág. 3). RN-15: só finalizadas entram (pág. 7)	A frase da pág. 3 parece fora de contexto, contém erro de digitação e contradiz RN-15 se for lida ao pé da letra (pontuar mesmo aberta).	Confirmar a intenção. Assumimos RN-15 e lista de abertas no fechamento (V18).	A
I-12	Ambiguidade	7	RN-11 e RN-16 (pág. 7); PV-08 (pág. 9)	“Solicitar desconsideração quando aplicável”: a quem, como e em que prazo? Não se diz se a ocorrência “indevida” entra na medição.	Definir o procedimento (V8).	M
I-13	Lacuna	5, 7, 9	Etapa 14 “Mensalmente” (pág. 5); RN-15 (pág. 7); PV-16 (pág. 9)	Sem data de corte, regra de competência, reabertura ou tratamento de ocorrência encerrada após o corte. Fato em um mês e encerramento em outro: qual mês pontua?	Definir com o Itaú (V16).	A
I-14	Lacuna	8, 9	RN-17, RN-18 (pág. 8); PV-17 (pág. 9)	Não há tabela de pontuação, pesos, faixas, vigência nem exemplo de cálculo. A ação de gestão depende de “faixas contratuais vigentes”.	Obter a tabela por contrato (V17).	A
I-15	Lacuna	3–5	Dor 2 “vários minutos” (pág. 3); “Dor 1”; oportunidades de desempenho (pág. 4)	Não há números: ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos, itens, tamanho do histórico, tempo real das telas, taxa de falha de e-mail. Sem isso não dá para fixar metas de desempenho e capacidade.	Pedir os volumes ao Itaú e medir o Thanos.	A
I-16	Lacuna	4, 7, 9	“Base única e integrações” (pág. 4); RN-02, RN-03 (pág. 6); PV-13 (pág. 9)	Não há inventário de sistemas: e-mail (qual serviço), login, fonte do RGI, cadastro de fornecedores, Teams, relatórios.	Levantar com a arquitetura do Itaú (V13, V26).	A

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-17	Lacuna	6, 7	RN-02 “carga horária” (pág. 6); RN-03 (pág. 6)	A hierarquia polo, prédio, torre, andar, posto e local e o papel da “carga horária” não estão explicados.	Pedir modelo de dados e exemplos reais.	M
I-18	Lacuna	7	RN-09, RN-10 (pág. 7)	Não há modelo do e-mail, lista de campos da ocorrência, nem como se tratam anexos e evidências (que aparecem em RN-05 e na Dor 5).	Pedir o e-mail atual e o formulário de ocorrência.	M
I-19	Lacuna (compliance)	3, 10	Dor 8 “Dados pessoais e documentos ficam nas observações” (pág. 3); PV-12 (pág. 10)	Risco de LGPD. Não há regra sobre quais dados, quem vê e por quanto tempo.	Envolver Privacidade/Jurídico do Itaú (V12, V21).	A
I-20	Lacuna	6–8	Nenhum trecho	Não há fluxo para o fornecedor contestar uma ocorrência, nem para a ausência de resposta, e-mail inválido, ocorrência duplicada ou ausência do responsável.	Incluímos contestação no To Be (V31). Confirmar se o processo existe.	A
I-21	Ambiguidade	3	Dor 1: “pode não apresentar erro e ainda assim não entregar o e-mail” (pág. 3)	A causa da falha não foi investigada (robô, serviço de e-mail, antispam). Sem causa, o novo sistema pode repetir o problema.	Pedir logs e um caso real de falha.	A
I-22	Ambiguidade	3	Dor 4: “não há lembretes efetivos” (pág. 3)	Não se sabe se existem lembretes que não funcionam ou se não existem.	Confirmar o que existe hoje.	B
I-23	Dependência	7, 8	RN-14 (pág. 7); RN-20 (pág. 8); PV-11	Permissões amplas “criadas para investigação” e regras de inativação cujo efeito sobre ocorrências abertas não está definido.	Definir segregação de funções (V11) e efeito da inativação (V14).	M
I-24	Lacuna	2, 8–9	Papéis (pág. 2); PV-10, PV-14 (pág. 9)	“Administrador do SIGMES” e “Gestão de Acessos” aparecem nas pendências, mas não nos papéis. “Responsável interno” (etapas 10–13) não é papel definido.	Fechar a lista de papéis (V1, V11).	M
I-25	Inconsistência	2, 3–4	Escopo “Redesenho To Be… fora” (pág. 2); seção 3 e “hub” (págs. 3–4, 10)	A seção 3 já propõe solução. O termo “hub” (“métricas dentro do hub”, “novo hub”) não é definido. A seção 3 não liga cada oportunidade a uma dor. Quase tudo é “Alta”.	Usar a seção 3 só como insumo. Definir “hub”.	B
I-26	Dependência	8, 10	RN-23 (pág. 8); PV-22 (pág. 10)	Módulo de atendimento técnico “construído, mas não usado”, com “sistema próprio do fornecedor” sem identificação.	Confirmar como fora de escopo (V23).	B

ID	Tipo	Pág.	Trecho citado	Problema	Ação sugerida	Sev.
I-27	Dependência	10	Roteiro (pág. 10); Fontes (pág. 10); PV-24	Só duas gravações de reunião e nenhuma amostra real. O fluxo nunca foi testado com casos reais. O key user é uma só pessoa.	Planejar homologação com amostra real (V25).	A
I-28	Forma	1, 4, 10	Capa e rodapés (págs. 1–10); etapa 2 “7.” (pág. 4); roteiro “8–12” (pág. 10)	Sem histórico de versões, aprovadores ou data de validação. A numeração continua erradamente entre listas. PDF sem número de página.	Corrigir se o As Is for reenviado.	B
I-29	Dependência	2–3, 9–10	Dor 15 (pág. 3); PV-21 (pág. 10)	Não se sabe quem mantém o Thanos hoje nem quem será o dono do novo produto. Impacta migração e desligamento.	Confirmar o dono e a equipe de suporte (V22).	M
I-30	Dependência	8–9	RN-19, PV-15 (págs. 8–9)	A carga em lote “existe, mas não é confiável”. Não se sabe se entra no escopo nem qual é o formato.	Definir escopo (V15).	M
I-31	Lacuna	—	Nenhum trecho	Não há dados para migração: quanto histórico, formato, qualidade, ocorrências abertas e regra de desligamento do Thanos.	Definir com o Itaú (V29, V30).	A

2.1 Resumo dos achados

Severidade	Quantidade
Alta	14
Média	12
Baixa	5
Total	31

2.2 Pendências do As Is (PV-01 a PV-24) e como serão tratadas

O As Is lista 24 pendências (págs. 8–10). Quase todas viram ponto para validação do Itaú no documento enviado ao cliente.

Pontos novos que a Stefanini acrescentou (V26 a V31): login e e-mail, hospedagem, papel da Stefanini, migração do histórico, desligamento do Thanos e contestação.

Pendência do As Is	Tema	Ponto para validação no documento do Itaú
PV-01	Responsável pelo acompanhamento	V1
PV-02	Critério de encerramento	V2
PV-03	Status e efeitos	V3, V18
PV-04	Prazo para encerramento	V4
PV-05	Retorno do fornecedor	V5
PV-06	Confirmação de entrega do e-mail	V6
PV-07	Lista de destinatários	V7
PV-08	Procedimento de correção	V8
PV-09	Matriz de classificação	V9
PV-10	Critérios de acesso	V10
PV-11	Segregação de funções	V11
PV-12	Dados pessoais	V12
PV-13	Cadastro mestre e fonte oficial	V13
PV-14	Governança cadastral	V14
PV-15	Carga em lote	V15
PV-16	Periodicidade e corte	V16
PV-17	Tabela de pontuação	V17
PV-18	Indicadores normalizados	V19
PV-19	Aprovação das ações de gestão	V20
PV-20	Retenção e histórico	V21
PV-21	Sustentação	V22

Pendência do As Is	Tema	Ponto para validação no documento do Itaú
PV-22	Escopo do atendimento técnico	V23
PV-23	Timeout e segurança	V24
PV-24	Amostra de validação	V25

3. Análise do fluxograma original

Objetivo: avaliar etapas, decisões, integrações, entradas e saídas e tratamento de exceções do fluxo atual e apontar o que o novo sistema deve resolver.

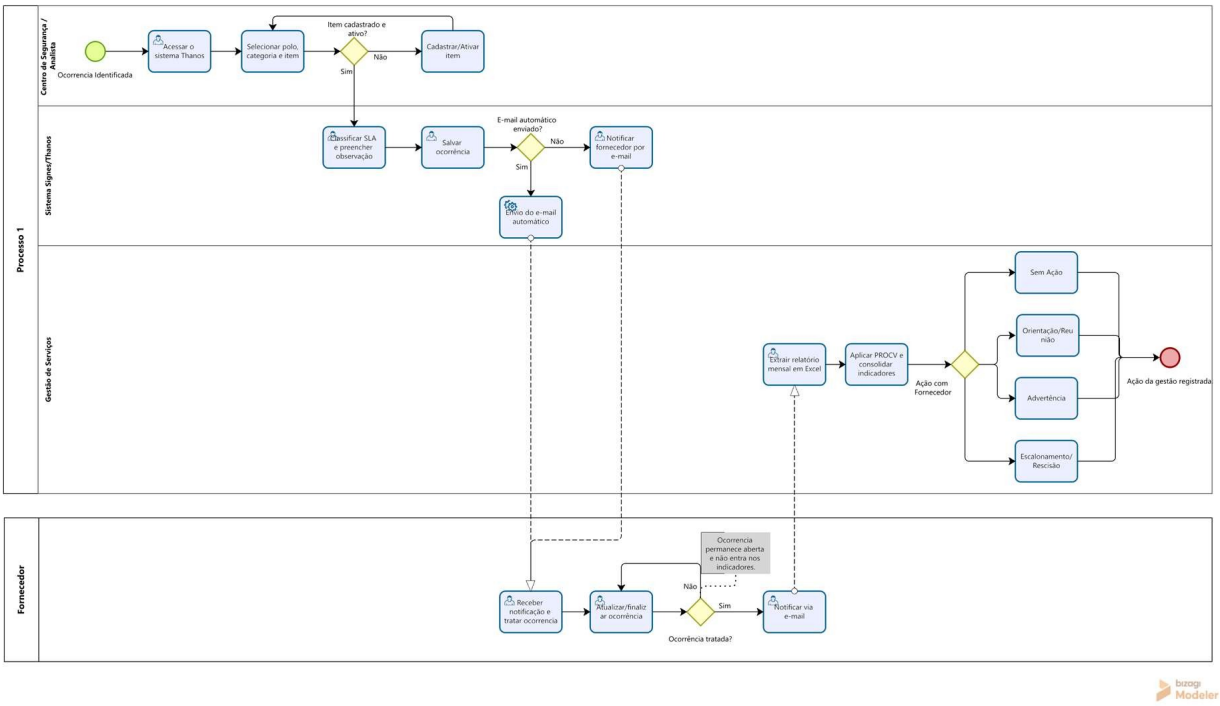


Figura 1 – Fluxograma As Is (pág. 6 do documento original).

3.1 O que o fluxograma contém

Elemento	Quantidade e descrição
Piscinas e raias	2 piscinas: Processo 1 (raias Centro de Segurança/Analista, Sistema Signes/Thanos, Gestão de Serviços) e Fornecedor.
Eventos	1 de início (“Ocorrência identificada”) e 1 de fim (“Ação da gestão registrada”). Não há evento de início mensal.
Atividades	16: acessar o sistema, selecionar polo/categoria/item, cadastrar/ativar item, classificar SLA, salvar, enviar e-mail automático, notificar por e-mail (manual), receber e tratar, atualizar/finalizar, notificar via e-mail, extrair relatório, aplicar PROCV, e 4 ações de gestão.
Decisões	4: item cadastrado e ativo; e-mail enviado; ocorrência tratada; ação com fornecedor (sem rótulo claro).
Entradas e saídas	Entrada: fato observado. Saída: ação de gestão registrada. As entradas e saídas de cada etapa não aparecem na figura. Estão só no texto (págs. 4–5).
Integrações	Só duas: e-mail automático e Excel (manual). Cadastro mestre e log existem no texto, mas não na figura.
Exceções tratadas	3: item inativo, falha de e-mail e ocorrência não tratada (fica aberta).

3.2 Divergências entre figura e texto

Ver achados I-02 a I-06 da seção 2. Resumo: quem finaliza, raias de duas atividades, seta do fornecedor para o relatório, gateway de ação sem rótulo e fluxo de acesso ausente.

3.3 Gargalos

- **Notificação:** quando o e-mail falha, tudo para até alguém avisar manualmente, e não há prova de entrega.
- **Cadastro de item:** sem item ativo não se abre a ocorrência. Depende do Analista ou do Gestor, sem prazo.
- **Fornecedor sem prazo:** o laço “ocorrência tratada? Não” não tem limite de tempo nem lembrete.
- **Fechamento mensal:** depende de extração, PROCV e tabela dinâmica feitas à mão.
- **Desempenho:** telas e consultas levam minutos (Dor 2, pág. 3).
- **Abertura individual:** documentos de terceiros são registrados um a um (Dor 9).

3.4 Redundâncias

- Notificação automática e manual, com controle paralelo.
- Dados digitados no sistema e de novo em Excel, e-mail e filas próprias (Dor 14).
- Correção de fornecedor por encerramento e nova abertura (RN-11).
- Cadastros em vários lugares com padronização manual (Dor 11).
- Extração e consolidação mensal que o sistema poderia calcular.

3.5 Etapas manuais

Etapa	Manual hoje	No novo fluxo
Notificação em caso de falha (etapa 8)	Sim	Reenvio automático e alerta (passos 11–12)
Controle paralelo de notificações	Sim (planilha e e-mail)	Status dentro do sistema
Extração mensal (etapa 14)	Sim	Fechamento automático (passo 19)
PROCV e tabela dinâmica (etapa 15)	Sim	Cálculo automático (passo 20)
Correção de fornecedor	Sim (encerrar e abrir outra)	Correção com reenvio (passo 16)
Lembrete de pendência	Não existe efetivo	Lembretes automáticos (passo 14)
Cadastro e carga em lote	Parcialmente manual	Carga assistida (passo 7)

3.6 Exceções que o fluxo atual não cobre

- Dado errado na ocorrência (além de fornecedor).
- Contestação do fornecedor.
- Fornecedor que não responde.
- E-mail inválido ou sem destinatário.
- Responsável ausente.
- Sessão expirada no meio do preenchimento (Dor 12).
- Ocorrência aberta no dia do corte e encerrada depois.
- Reabertura de ocorrência finalizada.

- Ocorrência duplicada.
- Recusa de acesso comunicada ao solicitante.

3.7 Limitações da plataforma atual que o novo sistema deve resolver

> **Atenção**
> A tabela abaixo mistura evidências do As Is com limitações **conhecidas do Power Automate**, que usamos como hipótese porque o PDF não confirma a plataforma (achado I-01). Validar com a equipe que mantém o Thanos antes de usar em reunião.

Limitação	Evidência no As Is ou hipótese	Como o novo sistema responde
Falha silenciosa de fluxos e de e-mail	Dor 1 (pág. 3). Hipótese: fluxo falha sem alerta e envia por conta ou conector sujeito a limites.	Fila de notificações com status, tentativas e alertas; remetente corporativo.
Dependência de conexão de uma pessoa	Hipótese: conexões em nome de um usuário expiram e quebram o fluxo.	Conta de serviço e monitoramento.
Histórico de execução curto	Hipótese: o histórico de execuções fica poucos dias. Dificulta investigar o que aconteceu.	Auditoria própria e retenção definida pelo Itaú.
Consultas e filtros lentos	Dores 2 e 3 (pág. 3). Hipótese: limites de listas e de consulta.	Banco de dados com índices, paginação e filtros.
Regras de cálculo difíceis de manter	Dor 13 (pág. 3). Pontuação em Excel.	Pontuação parametrizada por contrato e vigência.
Sessão e rascunho	Dor 12; RN-21 (págs. 3, 8).	Aviso, renovação e rascunho automático.
Sem dono e sem evolução	Dor 15; PV-21 (págs. 3, 10).	Sustentação com dono, canal e prazos.
Dados pessoais em campo livre	Dor 8; PV-12.	Campos próprios, mínimos e protegidos.

3.8 Dores do As Is e como o novo fluxo as resolve

Dor (pág. 3)	Resposta no novo fluxo	Passos
1 Instabilidade no e-mail	Status, reenvio automático e alerta	10 a 12
2 e 3 Lentidão e filtros	Filtros completos e paginação (requisito)	Todos
4 Abertas fora dos indicadores	Lembretes, painel e lista de abertas no fechamento	14, 17, 19, 21
5 Encerramento sem justificativa	Motivo e evidência obrigatórios	18
6 Permissões amplas	Edição e encerramento pelo responsável; exceções justificadas	14 a 18
7 Correção não reenvia	Reenvio controlado e aviso de desconsideração	15, 16
8 e 9 Terceiros, abertura individual	Fora da entrega base; a confirmar (V12)	—
10 e 11 Carga em lote e cadastros	Carga assistida e listas controladas (V15)	6, 7
12 Timeout	Aviso e rascunho	5, 8

Dor (pág. 3)	Resposta no novo fluxo	Passos
13 Medição fora do sistema	Cálculo automático	19, 20
14 Controles paralelos	Tudo no sistema	10 a 24
15 Sem sustentação	Sustentação Stefanini (V22)	12

4. Decisões de desenho adotadas e riscos para o time

Objetivo: registrar as hipóteses que usamos no novo fluxo e que podem mudar com a resposta do Itaú.

Decisão adotada	Por quê	Se o Itaú discordar
O fornecedor não acessa o sistema; responde por e-mail	O As Is diz “recebimento por e-mail” (pág. 2)	Criar acesso ou link seguro para o fornecedor (V5). Aumenta o escopo.
Só ocorrências finalizadas pontuam	RN-15 (pág. 7)	Se abertas pontuarem, muda o passo 19 e o cálculo.
Competência = mês do encerramento	Sem regra no As Is; é o critério mais simples	Mudar o passo 19 (V16).
3 tentativas de reenvio (5, 15 e 60 minutos)	Proposta nossa	Ajustar parâmetros (V6).
Papel da Stefanini: sustentação e investigação de falhas de envio	Proposta nossa	Rever custos e equipe (V28).
Go-live em 21/01 e desligamento em 29/01	A data de 29/01 não diz se é go-live ou desligamento	Se for go-live, não há convivência; se for desligamento, o prazo é muito apertado (V30).
Módulo de terceiros, indicadores avançados e carga em lote ficam condicionados ao prazo	Média prioridade no As Is (pág. 4); prazo de 13 semanas	Se o Itaú exigir, replanejar ou reduzir outro escopo.

Riscos de prazo

Restam cerca de 13 semanas até 29/01/2027, com recesso de fim de ano no meio.

O primeiro fechamento mensal real no novo sistema ocorre depois do desligamento. Propusemos recalcular dezembro em paralelo.

Sem as respostas do Itaú até 19/11/2026, o congelamento do escopo em 30/11 fica em risco.

5. Dúvidas a esclarecer com o Itaú

Objetivo: reunir as perguntas que precisam de resposta antes de concluir a documentação. Estão em ordem de prioridade.

1. **Plataforma e nomes:** o Thanos é o SIGMES? Roda em Power Automate, em banco próprio ou em outra plataforma? Quem o mantém? (I-01)
2. **Quem encerra a ocorrência:** o responsável interno ou o fornecedor? O fornecedor acessa o sistema? (I-02, V5)
3. **Pontuação:** podemos receber a tabela vigente de cada contrato, com um exemplo de cálculo real? (V17)

4. **Status e classificação:** qual a lista completa de status e a matriz de severidade? (V3, V9)
5. **Medição:** qual a data de corte e a regra de competência? Ocorrências abertas pontuam? (V16, V18)
6. **Prazo final:** 29/01/2027 é entrada em produção ou desligamento do Thanos? (V30)
7. **Volumes:** quantas ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos e itens, e qual o tamanho do histórico? (I-15)
8. **Integrações:** qual o serviço de login, o serviço de e-mail e a fonte oficial de RGI, polos e fornecedores? (V13, V26)
9. **E-mail:** qual a causa conhecida das falhas e qual o modelo do e-mail atual? (I-21, I-18)
10. **Dados pessoais:** quais dados de terceiros podem ser registrados e por quanto tempo? Privacidade já foi envolvida? (V12, V21)
11. **Contestação e exceções:** existe processo quando o fornecedor discorda ou não responde? (V31)
12. **Amostra real:** quais três ocorrências reais usaremos para validar o fluxo? (V25)
13. **Pessoas:** quem valida pelo Itaú além do key user e quem substitui no recesso? (R9, R10)
14. **Escopo:** módulo de terceiros, carga em lote e indicadores avançados entram nesta entrega? (V12, V15, V19)
15. **Migração:** quanto histórico migrar e o que fazer com ocorrências abertas no corte? (V29)
16. **Hospedagem e segurança:** onde o sistema será hospedado e quais políticas do Itaú se aplicam? (V27)

Próximos passos

- Alinhar este relatório com a equipe e fechar as dúvidas 1 a 6 em reunião rápida com o key user.
- Revisar e enviar ao Itaú a documentação do novo sistema (arquivo separado).
- Receber as respostas até 19/11/2026 e atualizar o fluxo e os passos.
- Registrar o resultado das validações e congelar o escopo em 30/11/2026.

N1 IT | Grupo Stefanini

Grupo Stefanini · Documento corporativo

Novo Sistema de Gestão e Medição de Serviços (SLA)

Documentação do processo para validação do Itaú

Cliente	Itaú
Processo	Gestão e Medição de Serviços (SLA)
Sistema que será substituído	Thanos
Elaborado por	N1 IT | Grupo Stefanini
Versão	1.0 – para validação
Data	Outubro de 2026
Prazo de conclusão do projeto	29/01/2027

Confidencial | Uso restrito ao Itaú e à Stefanini

Como ler este documento

Objetivo desta seção: ajudar você a ler o documento do jeito mais rápido, sem precisar de uma reunião de apresentação.

Este documento explica como funcionará o novo sistema que vai substituir o Thanos. Ele foi escrito para pessoas de negócio e de tecnologia. Você pode lê-lo do começo ao fim ou ir direto ao que precisa.

Se você quer…	Leia a seção
Entender em uma página o que muda	1. Resumo executivo
Conferir o significado de um termo ou sigla	2. Glossário
Ver o que melhora em relação ao Thanos	3. Como é hoje x como será
Ver o desenho do novo processo	4. Novo fluxograma
Entender cada etapa em detalhe	5. Passo a passo
Ver um caso real de ponta a ponta	6. Exemplo prático
Saber quais sistemas se conectam	7. Integrações
Conferir segurança, desempenho e auditoria	8. Requisitos não funcionais
Saber como será a troca do Thanos	9. Migração e convivência
Saber o que o Itaú precisa fazer e quando	10. Cronograma e 13. Pontos para validação
Conhecer os riscos e o que faremos	11. Riscos
Ver premissas, limites e pontos abertos	12. Premissas, restrições e pontos em aberto
Aprovar o fluxo	14. Validação e aceite

> **O que pedimos ao Itaú**
> 1. Ler as seções 4 e 5 e confirmar se o fluxo representa o processo desejado.
> 2. Responder aos **pontos para validação** (seção 13) até **19/11/2026**.
> 3. Assinar o aceite (seção 14) ou registrar ressalvas.

Convenções: os passos do fluxo têm numeração de 1 a 24. A mesma numeração aparece no fluxograma (seção 4) e no passo a passo (seção 5). Os pontos para validação têm a sigla **V** e um número (por exemplo, V9).

1. Resumo executivo

Objetivo desta seção: mostrar em uma página o que é o novo sistema, por que o Thanos será substituído e o que muda para o Itaú.

O que é

O novo sistema registra falhas na execução de serviços contratados, avisa o fornecedor, acompanha o tratamento e calcula a pontuação mensal dos fornecedores. Ele faz o mesmo trabalho do Thanos, com mais controle e sem planilhas paralelas.

Por que substituir o Thanos

- O envio automático de e-mail ao fornecedor às vezes falha, e o Itaú precisa avisar manualmente.
- Consultas e relatórios demoram, e faltam filtros importantes.
- A pontuação mensal depende de Excel (PROCV e tabela dinâmica), o que gera retrabalho e risco de erro.
- Ocorrências podem ser encerradas sem motivo ou evidência, e ocorrências abertas ficam fora da medição sem aviso.

O que muda para o Itaú

Hoje	No novo sistema
E-mail pode falhar sem ninguém saber	Cada notificação tem status (enviado, entregue, falhou), reenvio automático e alerta
Encerramento sem motivo	Motivo, evidência e responsável obrigatórios
Ocorrências abertas esquecidas	Lembretes e painel de ocorrências abertas e vencidas
Pontuação em Excel	Pontuação calculada pelo sistema, com histórico
Log técnico, difícil de ler	Histórico em linguagem de negócio: quem, quando, o que mudou e por quê

Quadro-resumo	
Prazo	Conclusão em **29/01/2027**
Entrada em produção (proposta)	21/01/2027, com convivência com o Thanos até 29/01/2027
Fluxo proposto	24 passos em 4 fases: acesso, registro, tratamento e medição
Primeira data para o Itaú	**19/11/2026**: devolver a validação do fluxo e os pontos da seção 13

2. Glossário

Objetivo desta seção: explicar os termos e as siglas usados neste documento, em ordem alfabética.

Termo	Significado
Ação de gestão	Decisão da Gestão de Serviços sobre um fornecedor após a análise mensal: nenhuma ação, orientação ou reunião, advertência, ajuste operacional, escalonamento ou processo de rescisão.
Aberta indevidamente	Status de uma ocorrência registrada por engano. Ela não conta na medição.
Alçada	Limite de decisão de uma pessoa ou cargo. Define quem pode aprovar cada ação.
Analista	Perfil de acesso que cadastra dados, abre, edita e encerra ocorrências.
Auditoria (trilha de)	Registro de quem fez o quê, quando e por quê, para consulta e conferência.
Categoria / Tipo / Item	Níveis que descrevem o serviço contratado. A categoria é o grupo maior, o tipo detalha e o item é o serviço específico em que a ocorrência é aberta.
Centro de Segurança	Equipe do Itaú que observa e registra desvios, principalmente de disponibilidade de postos.
Classificação de SLA	Gravidade do desvio (por exemplo, leve, moderada, grave ou gravíssima), conforme a matriz do Itaú.
Competência	Mês em que uma ocorrência conta na medição.
Convivência	Período em que o Thanos e o novo sistema existem ao mesmo tempo, durante a troca.
Data de corte	Dia em que o sistema fecha o mês e congela os dados para calcular a pontuação.
Encerramento	Ato de finalizar uma ocorrência depois de tratada, informando status final, motivo e evidência.
Evidência	Prova de que algo aconteceu ou foi resolvido (foto, e-mail, documento, registro).
Fornecedor	Empresa contratada pelo Itaú que presta o serviço e recebe as notificações.
Gestão de Serviços	Área do Itaú que analisa a pontuação mensal e decide as ações de gestão.
Gestor / aprovador	Perfil de acesso que aprova pedidos de acesso e pode executar funções administrativas.
Go-live	Dia em que o novo sistema entra em uso real.
Homologação	Fase de testes em que o Itaú confere se o sistema funciona como combinado, antes de ir para produção.
ID	Número único que identifica cada ocorrência.
Integração	Ligação entre o novo sistema e outro sistema ou fonte de dados.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados. Regula o uso de dados pessoais.
Log	Registro automático das ações feitas no sistema.
Medição	Cálculo mensal da pontuação dos fornecedores a partir das ocorrências finalizadas.
Notificação	E-mail enviado ao fornecedor para informar uma ocorrência.

Termo	Significado
Novo sistema	Sistema que substituirá o Thanos neste projeto.
Ocorrência	Registro de um desvio na execução de um serviço contratado.
Operador	Perfil de acesso que registra ocorrências.
Perfil de acesso	Conjunto de permissões de uma pessoa no sistema: Operador, Analista ou Gestor.
Plano de ação	Combinado para corrigir o desvio. Cada ocorrência tem um status do plano de ação.
Polo	Local ou prédio onde o serviço é prestado. É identificado pelo RGI.
Pontuação	Nota calculada por fornecedor, com base nas ocorrências finalizadas e na tabela contratual.
Posto	Posição de serviço dentro de um polo, como uma portaria.
Produção	Ambiente real de uso do sistema.
Quadro de saúde do fornecedor	Visão resumida da pontuação e das ocorrências de cada fornecedor.
Rascunho	Versão ainda não salva de um preenchimento. O novo sistema a guarda automaticamente.
Rescisão	Encerramento do contrato com o fornecedor.
RGI	Registro Geral de Imóvel. No processo, identifica de forma única cada prédio ou polo.
Rollback	Volta ao estado anterior (neste caso, voltar a usar o Thanos) se houver problema grave.
SLA	Service Level Agreement (acordo de nível de serviço). Define o padrão de serviço que o fornecedor deve cumprir.
SSO / login corporativo	Entrada no sistema com o mesmo acesso usado nos demais sistemas do Itaú.
Status	Situação da ocorrência, como Aberta, Finalizada ou Aberta indevidamente.
Thanos	Sistema atual do Itaú para gestão e medição de serviços (SLA).
Stefanini (N1 IT | Grupo Stefanini)	Empresa que constrói, implanta e sustenta o novo sistema.

3. Como é hoje x como será

Objetivo desta seção: comparar, ponto a ponto, o Thanos de hoje com o novo sistema e mostrar o ganho de cada mudança.

A tabela segue a ordem do processo. Itens marcados com **V** dependem da confirmação do Itaú na seção 13.

Ponto	Como é hoje (Thanos)	Como será (novo sistema)	Ganho
Pedido de acesso	Formulário fora do sistema; um ponto focal cadastra o pedido.	Pedido feito no próprio sistema, com aprovação do gestor e histórico (V10).	Menos etapas e acesso rastreável.
Cadastros (polos, itens, fornecedores)	Cadastros em vários lugares. Erro de grafia impede cargas.	Listas controladas, validação antes de salvar e carga em lote assistida (V13, V15).	Menos retrabalho e dados padronizados.
Abertura da ocorrência	Pessoa preenche; sessão cai em 30 minutos sem aviso e perde o texto.	Rascunho automático, aviso antes de expirar e campos obrigatórios claros (V24).	Nenhum preenchimento perdido.
Notificação ao fornecedor	Robô envia e-mail; pode falhar sem erro. Itaú avisa manualmente e controla em planilha.	Status do envio, reenvio automático (até 3 vezes) e alerta ao responsável (V6).	Fornecedor sempre avisado, com prova.
Correção de fornecedor	Corrigir não reenvia o aviso. É preciso encerrar e abrir outra ocorrência.	Correção com reenvio controlado e aviso de desconsideração ao fornecedor anterior (V8).	Menos ocorrências duplicadas.
Acompanhamento	Sem lembretes efetivos. Ocorrências abertas ficam esquecidas.	Lembretes por e-mail e painel de ocorrências abertas e vencidas (V1, V4).	Nada fica parado sem ninguém ver.
Encerramento	Pode encerrar sem motivo ou evidência.	Motivo, evidência, responsável e data obrigatórios (V2).	Histórico claro e confiável.
Permissões	Perfis amplos: quem tem permissão edita ou fecha ocorrência de outra pessoa.	Edição e encerramento por responsável, com justificativa nas exceções (V11).	Menos alteração indevida.
Consulta e filtros	Telas lentas; faltam filtros por período, código, prédio e outros.	Filtros por período, ID, polo, prédio, categoria, tipo, item, fornecedor, status e responsável, com paginação.	Resposta rápida e busca completa.
Histórico (log)	Existe, mas é técnico e difícil de ler.	Histórico em linguagem de negócio: quem, quando, o quê, antes e depois.	Auditoria acessível.
Medição e pontuação	Exportação para Excel, PROCV e tabela dinâmica.	Cálculo no sistema, com tabela de pontuação por contrato e vigência (V16, V17).	Fim da planilha paralela e menos erro.
Ocorrências abertas na medição	Só ocorrências finalizadas entram; as abertas somem da análise.	Só as finalizadas pontuam, mas as abertas aparecem em lista no fechamento (V18).	Decisão com visão completa.
Comparação entre fornecedores	Baseada no volume total de ocorrências.	Também por posto, efetivo e criticidade (V19).	Comparação mais justa.
Controles paralelos	E-mail, Excel e filas próprias.	Tudo no sistema: notificação, pendência e histórico.	Uma única fonte de verdade.

Ponto	Como é hoje (Thanos)	Como será (novo sistema)	Ganho
Dados pessoais de terceiros	Ficam no campo livre de observação.	Campos próprios e protegidos, com o mínimo necessário (V12).	Aderência à LGPD.
Sustentação	Funções deixaram de funcionar por falta de manutenção.	Sustentação com responsável, canal e prazos acordados (V22).	Sistema mantido e evoluído.

4. Novo fluxograma do processo

Objetivo desta seção: mostrar, em desenho, como o processo funcionará no novo sistema. O desenho tem 24 passos numerados, decisões, exceções e a indicação de quem faz cada etapa (Itaú, Stefanini, fornecedor ou sistema).

Primeiro vem a visão geral. Depois, cada fase aparece em detalhe. Os números dos passos são os mesmos do texto da seção 5.

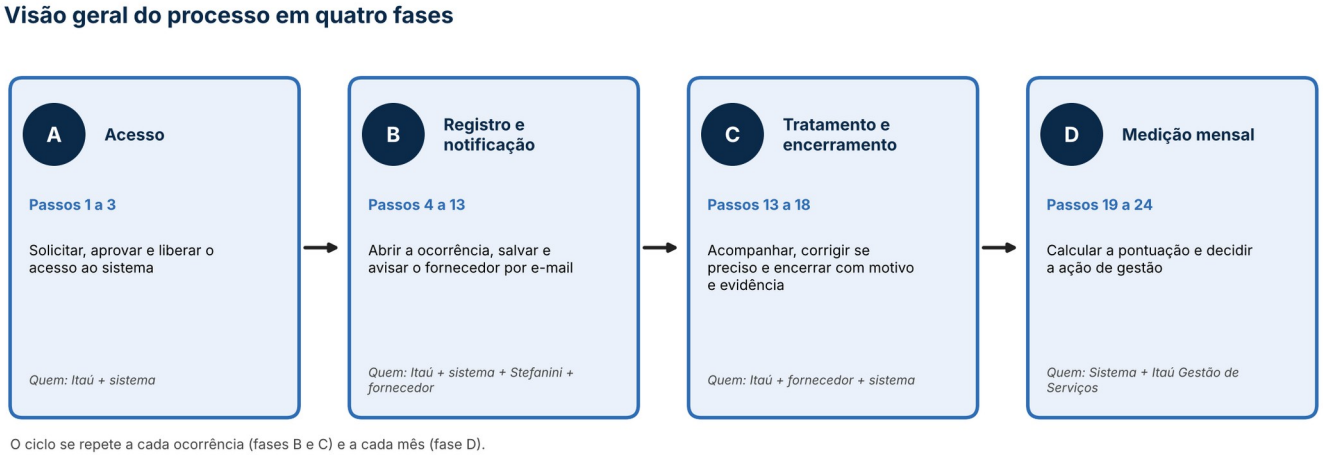


Figura 1 – Visão geral: quatro fases do processo.

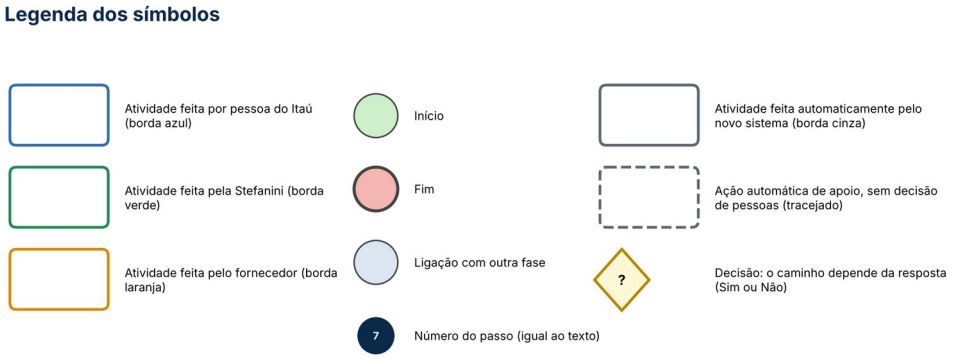


Figura 2 – Legenda dos símbolos.

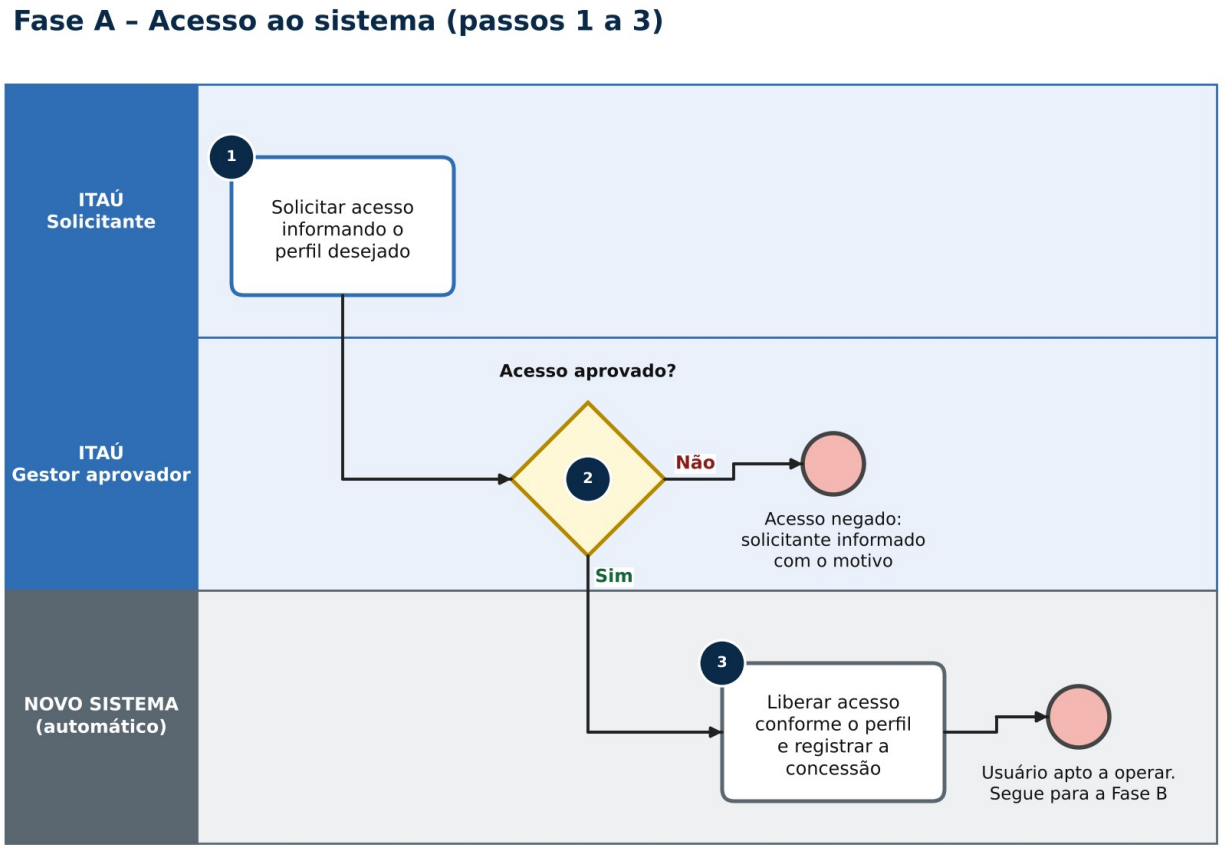


Figura 3 – Fase A: acesso ao sistema (passos 1 a 3).

Esta fase é feita uma vez por pessoa. Quem já tem acesso começa a partir da fase B.

Fase B – Registro da ocorrência e notificação ao fornecedor (passos 4 a 13)

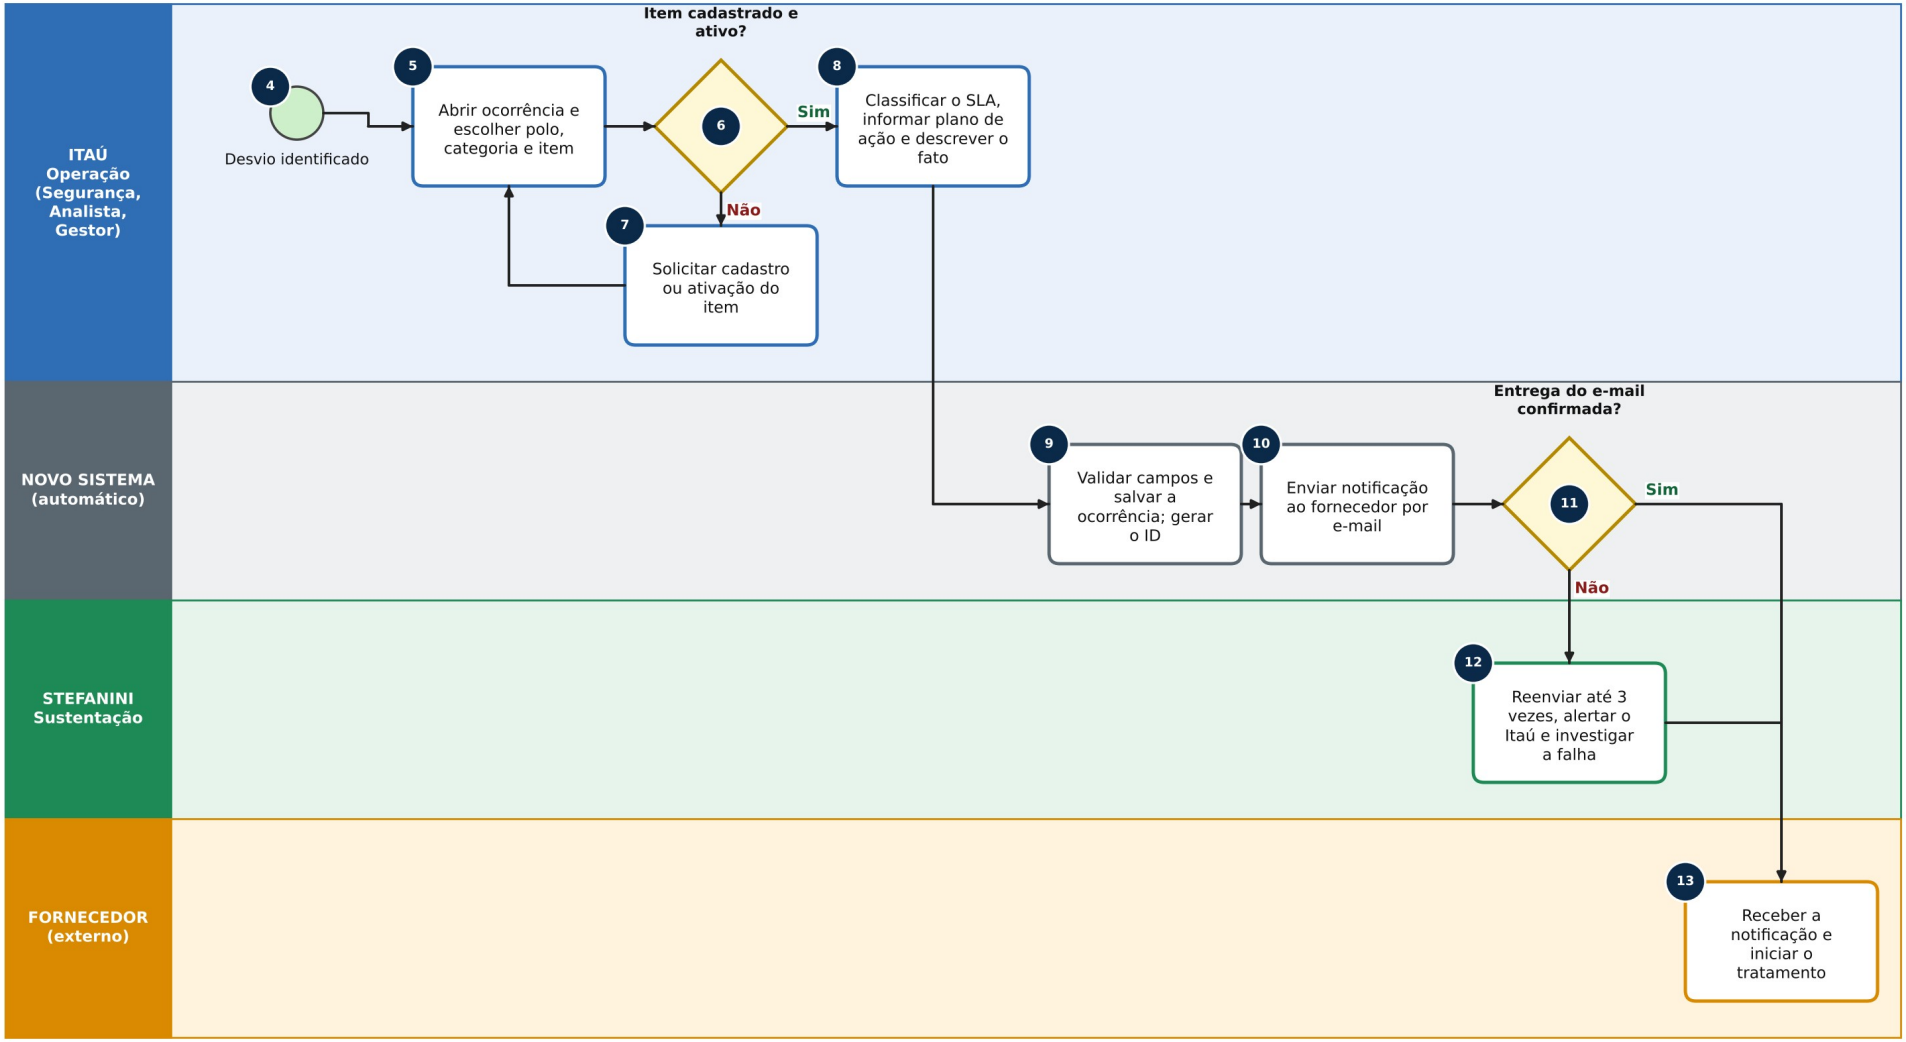


Figura 4 – Fase B: registro da ocorrência e notificação ao fornecedor (passos 4 a 13).

Fase C – Tratamento, correção e encerramento (passos 13 a 18)

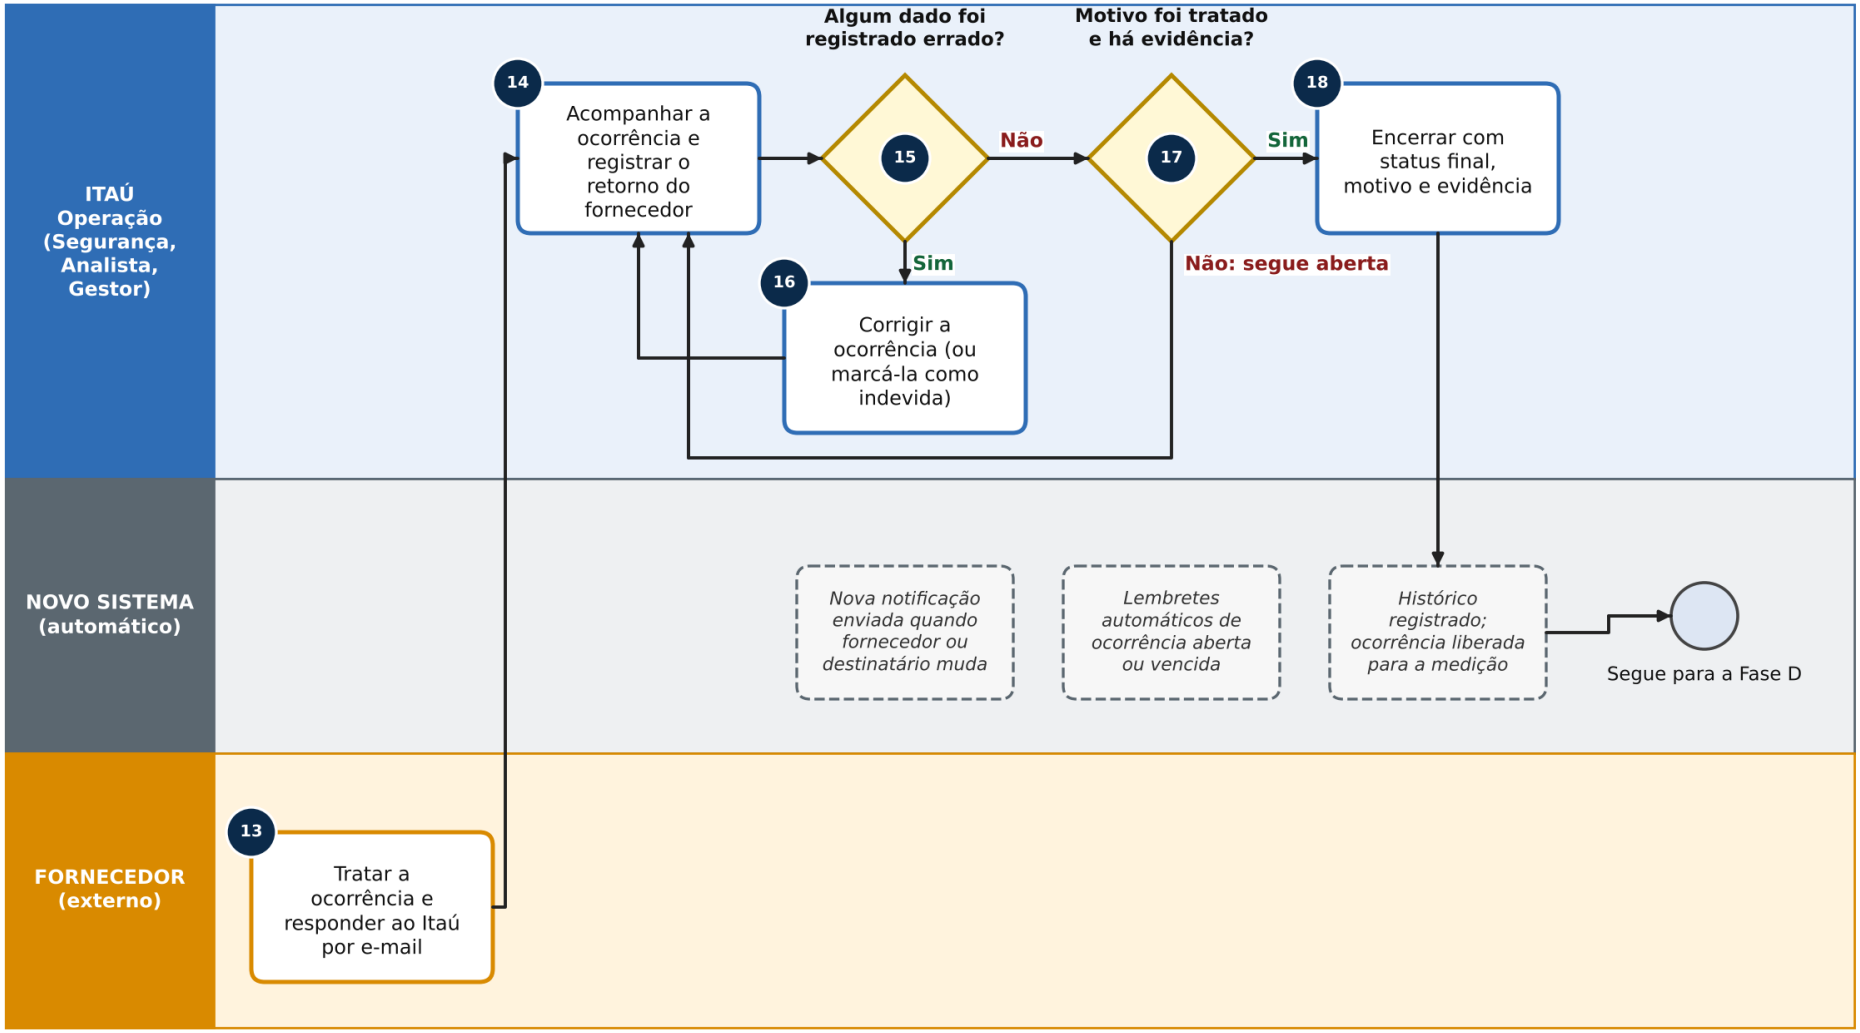


Figura 5 – Fase C: tratamento, correção e encerramento (passos 13 a 18). Os quadros tracejados mostram ações automáticas do sistema.

Fase D – Medição mensal e ação de gestão (passos 19 a 24)

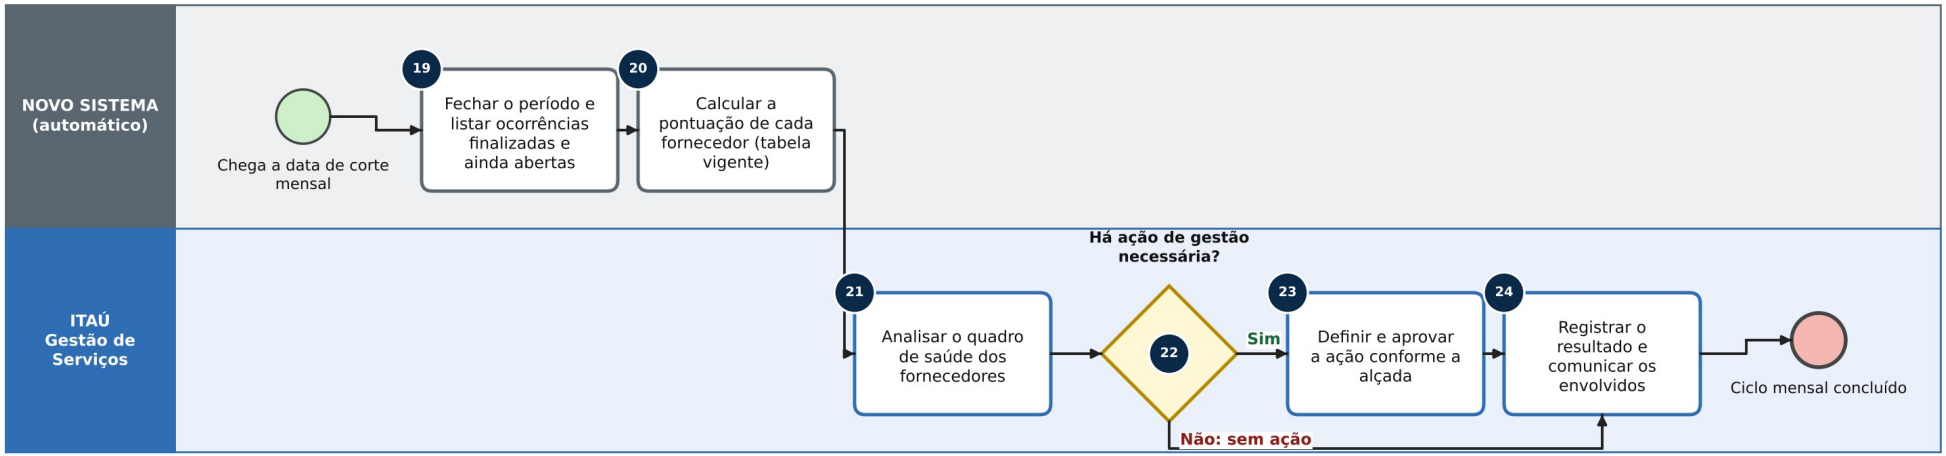


Figura 6 – Fase D: medição mensal e ação de gestão (passos 19 a 24).

Quem faz o quê

Responsável	Passos	Papel no processo
Itaú – Solicitante e Gestor aprovador	1, 2	Pede e aprova acessos.
Itaú – Operação (Centro de Segurança, Analista, Gestor)	4 a 8, 14 a 18	Identifica o desvio, registra, acompanha, corrige e encerra.
Itaú – Gestão de Serviços	21 a 24	Analisa a pontuação e decide a ação de gestão.
Fornecedor	13	Recebe a notificação, trata e responde.
Novo sistema (automático)	3, 9 a 11, 19, 20	Salva, notifica, confere entrega, fecha o período e calcula.
Stefanini – Sustentação	12 (e apoio ao sistema)	Investiga falhas de envio e mantém o sistema funcionando.

5. Passo a passo de cada etapa

Objetivo desta seção: explicar cada passo do fluxograma, com a mesma numeração: o que acontece, quem faz, o que entra, o que sai e o que ocorre em caso de erro ou exceção.

Cada quadro tem o número e o nome do passo, igual ao fluxograma. A linha “Ponto a validar” indica onde o Itaú precisa confirmar uma regra na seção 13.

Fase A – Acesso

Passo 1 – Solicitar acesso	
Quem faz	Itaú – Solicitante
O que acontece	A pessoa abre o pedido de acesso no sistema e informa o perfil que precisa: Operador, Analista ou Gestor.
O que entra	Nome, área, função e perfil desejado.
O que sai	Pedido registrado e enviado ao gestor aprovador.
Se houver erro ou exceção	Campo obrigatório vazio: o sistema avisa e não envia o pedido.
Ponto a validar	V10

Passo 2 – Aprovar acesso? (decisão)	
Quem faz	Itaú – Gestor aprovador
O que acontece	O gestor analisa o pedido e decide. Se aprovar, o pedido segue para a liberação (passo 3). Se recusar, informa o motivo.
O que entra	Pedido de acesso.
O que sai	Decisão registrada (Aprovado ou Recusado) com data e nome de quem decidiu.
Se houver erro ou exceção	Pedido recusado: o solicitante recebe o motivo por e-mail e o fluxo termina. Gestor sem resposta em 3 dias úteis: o sistema lembra e depois avisa o superior.
Ponto a validar	V10

Passo 3 – Liberar acesso conforme o perfil	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	O sistema cria o acesso com as permissões do perfil aprovado. O usuário entra com o login corporativo do Itaú.
O que entra	Pedido aprovado.
O que sai	Usuário ativo com o perfil correto. Concessão registrada no histórico.
Se houver erro ou exceção	Falha na integração de login: o pedido fica pendente e a Stefanini é avisada para corrigir.
Ponto a validar	V10, V26

Fase B – Registro e notificação

Passo 4 – Identificar o desvio	
Quem faz	Itaú – Centro de Segurança ou Analista
O que acontece	Uma pessoa percebe que um serviço contratado não foi cumprido: posto sem profissional, equipamento fora do ar, comportamento inadequado ou documento pendente.
O que entra	Fato observado e evidência disponível (foto, registro, relato).
O que sai	Decisão de registrar uma ocorrência.
Se houver erro ou exceção	Dúvida sobre se é um desvio: o caso vai para a operação decidir. O Centro de Segurança só registra o que consegue observar (como disponibilidade).
Ponto a validar	V9

Passo 5 – Abrir a ocorrência e escolher polo, categoria e item	
Quem faz	Itaú – Operação (Operador ou Analista)
O que acontece	A pessoa abre uma nova ocorrência e escolhe o polo (local), a categoria e o item do serviço. O sistema mostra só opções ativas e já preenche fornecedor e destinatários.
O que entra	Polo, categoria e item.
O que sai	Ocorrência em rascunho, ligada ao fornecedor correto.
Se houver erro ou exceção	Sessão perto de expirar: o sistema avisa e guarda o rascunho automaticamente.
Ponto a validar	V13, V24

Passo 6 – Item cadastrado e ativo? (decisão)	
Quem faz	Itaú – Operação
O que acontece	O sistema confere se o item existe e está ativo. Se sim, a pessoa segue para o passo 8. Se não, segue para o passo 7.
O que entra	Item escolhido.
O que sai	Caminho Sim (passo 8) ou Não (passo 7).
Se houver erro ou exceção	Nenhum item atende ao caso: a pessoa pede a criação do item (passo 7).
Ponto a validar	V13, V14

Passo 7 – Solicitar cadastro ou ativação do item	
Quem faz	Itaú – Analista ou Gestor
O que acontece	O Analista pede, e o Gestor aprova, a criação ou a ativação do item. O pedido fica registrado. Depois da liberação, a pessoa volta ao passo 5.
O que entra	Descrição do item, categoria, tipo e fornecedor.

Passo 7 – Solicitar cadastro ou ativação do item	
O que sai	Item criado ou ativado e disponível para uso.
Se houver erro ou exceção	Pedido recusado: o motivo fica registrado e a pessoa informada. A ocorrência pode ser registrada em outro item aplicável.
Ponto a validar	V14, V15

Passo 8 – Classificar o SLA e descrever o fato	
Quem faz	Itaú – Operação (Operador ou Analista)
O que acontece	A pessoa escolhe a classificação do SLA (por exemplo, leve, moderada, grave ou gravíssima) e o status do plano de ação. Depois descreve o fato e anexa as evidências. A descrição é obrigatória.
O que entra	Fato observado, evidências, regras de classificação.
O que sai	Ocorrência completa e pronta para salvar.
Se houver erro ou exceção	Descrição vazia ou classificação ausente: o sistema impede o salvamento e indica o campo. Dados pessoais de terceiros só entram nos campos próprios.
Ponto a validar	V9, V12

Passo 9 – Validar e salvar a ocorrência	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	O sistema confere os campos obrigatórios, salva a ocorrência e gera um número de identificação (ID) único. O ID serve para consultar a ocorrência e acompanhar o caso.
O que entra	Ocorrência completa.
O que sai	Ocorrência salva com ID, data, hora e autor registrados.
Se houver erro ou exceção	Falha ao salvar: nada se perde, o sistema mantém o rascunho e pede para tentar de novo. Duplicidade provável: o sistema alerta antes de salvar.
Ponto a validar	—

Passo 10 – Notificar o fornecedor por e-mail	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	Ao salvar, o sistema envia ao fornecedor um e-mail padronizado com os dados da ocorrência. Usa a lista oficial de destinatários e registra o envio.
O que entra	Ocorrência salva e lista de destinatários.
O que sai	E-mail enviado e registro do envio no histórico.
Se houver erro ou exceção	Fornecedor sem e-mail válido cadastrado: o sistema alerta o responsável antes de enviar.
Ponto a validar	V7, V26

Passo 11 – Entrega do e-mail confirmada? (decisão)	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	O sistema confere se o e-mail foi entregue. Se sim, a ocorrência segue ao fornecedor (passo 13). Se não, entra o tratamento de falha (passo 12).
O que entra	Retorno do serviço de e-mail.
O que sai	Status da notificação: Enviado, Entregue ou Falhou.
Se houver erro ou exceção	Sem confirmação de entrega em até 15 minutos: o sistema trata como falha.
Ponto a validar	V6

Passo 12 – Reenviar, alertar o Itaú e investigar a falha	
Quem faz	Novo sistema e Stefanini – Sustentação
O que acontece	O sistema reenvia o e-mail até 3 vezes. Se continuar sem entrega, alerta o responsável do Itaú e abre um chamado para a Stefanini investigar. Nesse caso, o Itaú contata o fornecedor por e-mail e registra o contato no sistema, para ninguém ficar sem aviso.
O que entra	Notificação com falha.
O que sai	Notificação entregue, ou contato manual registrado. Causa da falha documentada.
Se houver erro ou exceção	Falha repetida em vários envios: a Stefanini trata como incidente e informa o Itaú.
Ponto a validar	V6, V22, V28

Passo 13 – Receber a notificação e tratar a ocorrência	
Quem faz	Fornecedor
O que acontece	O fornecedor lê a notificação, corrige o problema na operação e responde ao Itaú com o que foi feito. Se discordar, pode contestar a ocorrência.
O que entra	E-mail de notificação.
O que sai	Resposta do fornecedor, com o que foi feito e evidências.
Se houver erro ou exceção	Sem resposta no prazo: o sistema avisa o responsável interno (passo 14) e pode reenviar o aviso ao fornecedor.
Ponto a validar	V5, V31

Fase C – Tratamento e encerramento

Passo 14 – Acompanhar a ocorrência e registrar o retorno	
Quem faz	Itaú – Responsável interno
O que acontece	O responsável acompanha o caso e registra na ocorrência o retorno do fornecedor. O sistema lembra o responsável das ocorrências abertas ou vencidas, por e-mail ou painel.

Passo 14 – Acompanhar a ocorrência e registrar o retorno	
O que entra	Resposta do fornecedor e prazos.
O que sai	Ocorrência atualizada, com histórico do que aconteceu.
Se houver erro ou exceção	Responsável ausente: o substituto assume e recebe os lembretes.
Ponto a validar	V1, V4, V11

Passo 15 – Algum dado foi registrado errado? (decisão)	
Quem faz	Itaú – Responsável interno
O que acontece	O responsável confere se há erro na ocorrência: fornecedor, item, destinatário ou descrição. Se houver, segue para o passo 16. Se não, segue para o passo 17.
O que entra	Ocorrência e retorno do fornecedor.
O que sai	Caminho Sim (passo 16) ou Não (passo 17).
Se houver erro ou exceção	—
Ponto a validar	V8

Passo 16 – Corrigir a ocorrência (ou marcá-la como indevida)	
Quem faz	Itaú – Responsável interno
O que acontece	O responsável corrige o dado. Se mudar o fornecedor, o item ou o destinatário, o sistema oferece reenviar a notificação. O fornecedor anterior recebe um aviso de desconsideração. Se a ocorrência não deveria existir, o responsável a marca como Aberta indevidamente, e ela deixa de contar na medição.
O que entra	Dado correto e justificativa.
O que sai	Ocorrência corrigida, nova notificação enviada e histórico antes/depois.
Se houver erro ou exceção	Correção sem justificativa: o sistema não grava. Perfil sem permissão: o pedido vai ao gestor.
Ponto a validar	V8, V11

Passo 17 – Motivo tratado e com evidência? (decisão)	
Quem faz	Itaú – Responsável interno
O que acontece	O responsável decide se o problema foi resolvido e se há evidência. Se sim, segue para o encerramento (passo 18). Se não, a ocorrência continua aberta e volta ao passo 14.
O que entra	Retorno do fornecedor e evidências.
O que sai	Caminho Sim (passo 18) ou Não (volta ao passo 14).
Se houver erro ou exceção	Ocorrência aberta passa do prazo: aparece como vencida e entra no painel da Gestão de Serviços. Enquanto aberta, não entra na medição.

Passo 17 – Motivo tratado e com evidência? (decisão)	
Ponto a validar	V2, V4, V18

Passo 18 – Encerrar a ocorrência com status final, motivo e evidência	
Quem faz	Itaú – Responsável interno
O que acontece	O responsável escolhe o status final e informa o motivo e a evidência do encerramento. Esses campos são obrigatórios. O sistema registra autor, data e hora e libera a ocorrência para a medição.
O que entra	Status final, motivo e evidência.
O que sai	Ocorrência Finalizada, com histórico completo.
Se houver erro ou exceção	Campo obrigatório vazio: o sistema impede o encerramento. Encerramento por outra pessoa exige justificativa registrada.
Ponto a validar	V2, V3, V11

Fase D – Medição mensal

Passo 19 – Fechar o período do mês	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	Na data de corte, o sistema fecha o período. Reúne as ocorrências finalizadas do mês e lista as que ainda estão abertas, para a Gestão de Serviços saber o que ficou de fora.
O que entra	Ocorrências do período e data de corte.
O que sai	Base do mês congelada e lista de ocorrências abertas.
Se houver erro ou exceção	Ocorrência finalizada depois do corte: entra no mês seguinte, conforme a regra de competência.
Ponto a validar	V16, V18

Passo 20 – Calcular a pontuação de cada fornecedor	
Quem faz	Novo sistema (automático)
O que acontece	O sistema aplica a tabela de pontuação vigente de cada contrato e calcula a pontuação por fornecedor. Gera também o quadro de saúde dos fornecedores. Substitui a planilha de Excel usada hoje.
O que entra	Ocorrências finalizadas e tabela de pontuação.
O que sai	Pontuação por fornecedor e quadro de saúde.
Se houver erro ou exceção	Tabela de pontuação ausente ou vencida: o sistema bloqueia o cálculo e avisa o administrador.
Ponto a validar	V17, V19

Passo 21 – Analisar o quadro de saúde dos fornecedores	
Quem faz	Itaú – Gestão de Serviços
O que acontece	A Gestão de Serviços revisa a pontuação, o histórico e as ocorrências ainda abertas de cada fornecedor.
O que entra	Quadro de saúde e lista de ocorrências abertas.
O que sai	Conclusão da análise para cada fornecedor.
Se houver erro ou exceção	Dúvida sobre uma ocorrência: a Gestão de Serviços volta à ocorrência e pede ajuste ao responsável.
Ponto a validar	V18, V19

Passo 22 – Há ação de gestão necessária? (decisão)	
Quem faz	Itaú – Gestão de Serviços
O que acontece	A Gestão de Serviços decide se o resultado pede ação. Se sim, segue para o passo 23. Se não, vai ao passo 24 e registra “sem ação”.
O que entra	Conclusão da análise e faixas contratuais.
O que sai	Caminho Sim (passo 23) ou Não (passo 24).
Se houver erro ou exceção	—
Ponto a validar	V17, V20

Passo 23 – Definir e aprovar a ação conforme a alçada	
Quem faz	Itaú – Gestão de Serviços
O que acontece	A Gestão de Serviços escolhe a ação: orientação ou reunião, advertência, ajuste operacional, escalonamento ou processo de rescisão. A ação é aprovada por quem tem alçada.
O que entra	Resultado do fornecedor e regras contratuais.
O que sai	Ação aprovada, com responsável e data.
Se houver erro ou exceção	Aprovação pendente: o sistema lembra o aprovador e mostra a pendência no painel.
Ponto a validar	V20

Passo 24 – Registrar o resultado e comunicar os envolvidos	
Quem faz	Itaú – Gestão de Serviços
O que acontece	A Gestão de Serviços registra a ação (ou “sem ação”) no sistema e comunica os envolvidos. O ciclo do mês termina.
O que entra	Ação aprovada ou decisão de não agir.
O que sai	Resultado do mês registrado, com histórico e relatório.

Passo 24 – Registrar o resultado e comunicar os envolvidos	
Se houver erro ou exceção	Erro no registro: o sistema mantém o rascunho e a Gestão de Serviços repete o passo.
Ponto a validar	V20

6. Exemplo prático de ponta a ponta

Objetivo desta seção: mostrar um caso do dia a dia percorrendo todo o fluxo, do início ao fim, incluindo duas exceções.

> **Aviso**
> Os nomes, datas e pontos abaixo são fictícios e servem só para ilustrar. A pontuação real depende da tabela contratual do Itaú (V17).

Situação: em 12/01/2027, às 02h40, o Centro de Segurança nota que o posto de portaria da Torre B do Polo Exemplo está sem profissional. O serviço é prestado pelo Fornecedor Exemplo A.

Quando	Passo	O que acontece
Dez/2026	1 a 3	Marina, analista do Itaú, pede acesso como Analista. O gestor aprova. O sistema libera o acesso com o login corporativo.
12/01 02h40	4	João, do Centro de Segurança, vê que o posto está vazio e tem a imagem da câmera como prova.
12/01 02h45	5, 6	João abre uma ocorrência e escolhe polo, categoria “Postos” e item “Portaria Torre B”. O item está ativo.
12/01 02h50	8	João classifica o desvio como “Grave”, descreve o fato e anexa a imagem. O sistema não deixa salvar sem a descrição.
12/01 02h52	9	O sistema salva e gera o ID 2027-000123.
12/01 02h52	10, 11	O sistema envia o e-mail ao Fornecedor Exemplo A. O primeiro envio não tem entrega confirmada.
12/01 03h07	12	**Exceção 1:** o sistema reenviou o e-mail e a segunda tentativa foi entregue. O responsável recebe aviso do reenvio e o histórico registra as duas tentativas.
12/01 08h00	13	O fornecedor lê a notificação, manda um profissional ao posto e responde por e-mail.
12/01 09h30	14, 15	Marina registra o retorno. Ao conferir, percebe que o posto pertence ao Fornecedor Exemplo B.
12/01 09h40	16	**Exceção 2:** Marina corrige o fornecedor e informa o motivo. O sistema avisa o Fornecedor A de que a ocorrência foi desconsiderada e notifica o Fornecedor B. O histórico guarda o antes e o depois.
13/01 10h00	13, 14	O Fornecedor B responde com a escala corrigida.
14/01	17, 18	Marina confirma que o motivo foi tratado, anexa a escala como evidência e encerra a ocorrência com status Finalizada.
31/01 (corte)	19, 20	O sistema fecha o mês. A ocorrência 2027-000123 entra na pontuação do Fornecedor B. O sistema lista duas ocorrências ainda abertas, que não pontuam. Para este exemplo, o Fornecedor B soma 12 pontos.
Início de fev	21 a 24	A Gestão de Serviços analisa o quadro. Pela tabela fictícia, 12 pontos pedem “orientação formal”. A ação é aprovada, registrada e comunicada ao fornecedor. O ciclo termina.

7. Integrações com sistemas e fontes de dados do Itaú

Objetivo desta seção: listar os sistemas e as fontes de dados com que o novo sistema se conectará e explicar para que serve cada ligação.

Uma integração evita digitar a mesma informação duas vezes e reduz erros. A coluna “Situação” mostra o que já está claro e o que o Itaú precisa confirmar.

Integração	Para que serve	O que troca	Situação
Login corporativo (SSO)	Entrar com o acesso usado no Itaú e aplicar os perfis.	Identidade do usuário e perfil.	A confirmar (V26)
Serviço de e-mail	Enviar notificações, lembretes e avisos, e saber se foram entregues.	E-mail enviado; retorno de entrega.	Em uso no Thanos; a confirmar o remetente (V26)
Cadastro oficial de RGI, polos e postos	Usar uma única fonte para prédios, polos e postos.	Lista de polos, RGI, torres, andares e postos.	A confirmar (V13)
Cadastro de fornecedores e contratos	Preencher fornecedor, destinatários e tabela de pontuação por contrato.	Fornecedores, contatos, contratos e vigência.	A confirmar (V7, V13, V17)
Cadastro de pessoas e documentos de terceiros	Relacionar pessoa, posto e documento quando a ocorrência for de documentação.	Dados mínimos de terceiros.	Depende do escopo de terceiros (V12)
Teams (opcional)	Enviar lembretes além do e-mail.	Mensagem de lembrete.	Opcional; a confirmar
Relatórios e exportação	Levar dados para os relatórios e para a análise da Gestão de Serviços.	Dados de ocorrências e pontuação.	A confirmar a ferramenta
Repositório de logs do Itaú	Guardar o histórico de auditoria no padrão do Itaú.	Registros de auditoria.	A confirmar (V21)
Thanos (origem da migração)	Ler os cadastros e o histórico para levar ao novo sistema.	Cadastros e ocorrências.	Necessário para a migração (V29)
Monitoração de equipamentos e câmeras	Abrir ocorrências automaticamente no futuro.	—	Fora desta entrega

8. Requisitos não funcionais

Objetivo desta seção: explicar, em linguagem simples, como o sistema deve se comportar em segurança, desempenho, disponibilidade e auditoria, além de funcionar corretamente.

As metas abaixo são **propostas da Stefanini** e precisam da confirmação do Itaú. Onde o Itaú já tiver um padrão, o padrão do Itaú prevalece.

Tema	O que significa	Meta proposta
Segurança de acesso	Só pessoas autorizadas entram. Cada pessoa vê e faz só o que seu perfil permite.	Login corporativo; perfis Operador, Analista e Gestor; revisão periódica dos acessos.
Sessão	O sistema não deixa o acesso aberto sem uso e não faz a pessoa perder o trabalho.	Expira em 30 minutos sem uso, com aviso 5 minutos antes e rascunho salvo (V24).
Proteção dos dados	Os dados ficam protegidos quando trafegam e quando estão guardados.	Criptografia em trânsito e em repouso; dados pessoais só nos campos próprios (V12).
Aderência às políticas do Itaú	O sistema segue as regras de segurança, privacidade e terceiros do Itaú.	Revisão das políticas aplicáveis na fase de desenho e teste de segurança antes da entrada em produção.
Desempenho	As telas respondem rápido, mesmo com ocorrências finalizadas.	Consultas e telas em até 3 segundos em 95% dos acessos, com o volume histórico migrado.
Capacidade	O sistema aguenta o volume atual e o crescimento.	Volume a levantar com o Itaú; teste de carga em homologação.
Disponibilidade	O sistema está no ar quando as pessoas precisam.	99,5% por mês, em dias úteis, das 7h às 20h (a confirmar).
Cópia de segurança e recuperação	Se algo der errado, os dados voltam.	Cópia diária; recuperação em até 4 horas e perda máxima de dados de 24 horas (a confirmar).
Logs e auditoria	Tudo que importa fica registrado e é fácil de ler.	Quem, quando, o quê, antes e depois e motivo, em tela amigável; retenção pelo prazo do Itaú (V21).
Entrega de e-mails	As notificações chegam e há prova disso.	Status por e-mail, 3 tentativas e alerta em caso de falha (V6).
Facilidade de uso	Fácil para quem usa pouco o sistema.	Telas em português, campos obrigatórios claros e funciona nos navegadores corporativos do Itaú.
Sustentação	Alguém cuida do sistema depois da entrega.	Responsável, canal, horários e prazos de atendimento acordados (V22).

9. Estratégia de migração e convivência com o Thanos

Objetivo desta seção: explicar como a Stefanini levará os dados do Thanos ao novo sistema, como os dois sistemas conviverão e como o Thanos será desligado, sem interromper o trabalho do Itaú.

Etapas da migração

Etapa	O que será feito	Quando (proposta)
1. Preparação	Mapear os dados do Thanos, limpar inconsistências e definir o que migrar (V29).	Nov/2026
2. Cadastros	Levar polos, categorias, tipos, itens, fornecedores e regras de SLA.	Dez/2026
3. Ensaios	Fazer duas cargas de teste e conferir os totais com o Itaú.	Dez/2026 a jan/2027
4. Corte	Congelar o Thanos para novos registros e fazer a carga final: histórico e ocorrências abertas.	20 a 21/01/2027
5. Convivência	Novas ocorrências só no novo sistema. O Thanos fica somente para consulta.	21 a 28/01/2027
6. Desligamento	Itaú aprova, o Thanos é desligado e seus dados são arquivados.	29/01/2027

Como os dois sistemas convivem

Assunto	Regra proposta
Novas ocorrências	Só no novo sistema, a partir do go-live. O Thanos não recebe mais registros.
Ocorrências abertas no Thanos	Migradas na carga final e encerradas no novo sistema (V29).
Consulta ao histórico	Consulta no Thanos durante a convivência e no novo sistema, para o que foi migrado.
Medição de dezembro/2026	Recalculada no novo sistema e comparada com a planilha atual. As diferenças são explicadas ao Itaú antes do aceite.
Notificações	Passam a sair apenas do novo sistema.
Acessos	Usuários do Thanos recebem acesso no novo sistema antes do go-live, por perfil.

Se algo der errado (volta ao Thanos)

Se houver falha grave nos primeiros cinco dias úteis, o Itaú e a Stefanini decidem juntos voltar a usar o Thanos. Por isso o Thanos só é desligado depois do aceite do Itaú. Os critérios de volta serão acordados na homologação.

> **Atenção ao prazo**
> A convivência tem apenas oito dias entre o go-live (21/01) e o desligamento (29/01). O primeiro fechamento mensal real do novo sistema só acontece no fim de janeiro. Por isso a medição de dezembro será recalculada em paralelo. Confirme este desenho no ponto V30.

10. Cronograma macro até 29/01/2027

Objetivo desta seção: mostrar as grandes etapas do projeto até 29/01/2027 e destacar as datas em que o Itaú precisa validar ou fornecer informações.

As datas são propostas e devem ser confirmadas na validação. Linhas em destaque exigem ação do Itaú.

Data	Marco ou atividade	Responsável
05/11/2026	Envio desta documentação ao Itaú	Stefanini
19/11/2026	**Itaú devolve a validação do fluxo e as respostas dos pontos da seção 13**	Itaú
26/11/2026	**Itaú entrega os insumos:** destinatários por fornecedor, matriz de classificação, tabela de pontuação, cadastros oficiais, acessos aos ambientes e contatos técnicos	Itaú
30/11/2026	Aceite do fluxo e congelamento do escopo	Itaú e Stefanini
30/11 a 18/12	Construção, etapa 1: acesso, cadastros, ocorrência e notificação	Stefanini
21/12/2026	Demonstração da etapa 1 e **validação intermediária do Itaú**	Itaú
04/01 a 15/01/2027	Construção, etapa 2: tratamento, encerramento, medição, relatórios e migração	Stefanini
12/01 a 20/01/2027	**Homologação pelo Itaú** com ocorrências reais de amostra	Itaú
20 a 21/01/2027	Carga final do Thanos e entrada em produção (go-live)	Stefanini e Itaú
21 a 28/01/2027	Convivência e operação assistida; recálculo da medição de dezembro	Stefanini e Itaú
28/01/2027	**Itaú aprova o desligamento do Thanos**	Itaú
29/01/2027	Encerramento do projeto e desligamento do Thanos	Stefanini e Itaú

Atenção: o fim do ano reduz a disponibilidade de pessoas. Pedimos que o Itaú indique, até 19/11, quem valida e aprova durante o recesso de fim de ano.

11. Riscos

Objetivo desta seção: apresentar os principais riscos do projeto, o impacto de cada um e como responderemos: mitigar (reduzir), aceitar, transferir ou evitar.

Probabilidade e impacto: A = alto, M = médio, B = baixo.

#	Risco	Prob. / Impacto	Resposta	Plano
R1	O prazo é curto (cerca de 13 semanas) para o escopo.	A / A	Mitigar	Entregar por etapas, congelar o escopo em 30/11 e tratar o que não for essencial como evolução.
R2	Atraso do Itaú em validações e insumos.	A / A	Mitigar	Datas de marco no cronograma, lembretes e escalonamento ao gestor do Itaú.
R3	Regras ainda não confirmadas (status, encerramento, pontuação).	M / A	Mitigar	Seção 13 com prazo de resposta e reunião de esclarecimento, se preciso.
R4	Dados do Thanos com erros ou duplicidades.	M / M	Mitigar	Limpeza prévia, duas cargas de teste e conferência de totais.
R5	Liberação tardia de acessos, ambientes e integrações (login, e-mail, cadastros).	M / A	Transferir	Responsabilidade do Itaú, com contato técnico indicado até 26/11. Sem a liberação, o prazo da integração se move.
R6	Provedor de e-mail bloqueia ou atrasa mensagens.	M / M	Mitigar	Remetente oficial do Itaú, testes de entrega e alerta de falha.
R7	Fornecedores demoram a responder ou resistem ao novo e-mail.	M / B	Aceitar	Comunicação do Itaú aos fornecedores e lembretes automáticos. O risco é aceito, pois depende do fornecedor.
R8	Convivência curta e primeiro fechamento só após 29/01.	A / M	Mitigar	Recalcular dezembro/2026 em paralelo e comparar com a planilha atual.
R9	Pessoas-chave indisponíveis no recesso de fim de ano.	M / M	Aceitar	Indicar substitutos até 19/11. Se faltarem, o cronograma é revisto.
R10	Dependência de uma só pessoa do Itaú para as regras.	M / M	Mitigar	Nomear um segundo validador e registrar as decisões.
R11	Dados pessoais de terceiros fora do padrão da LGPD.	M / A	Mitigar	Campos próprios, mínimo necessário e validação com Privacidade do Itaú (V12).
R12	Lentidão com o volume histórico.	B / A	Mitigar	Teste de carga em homologação e ajuste antes do go-live.
R13	Falha de serviços de terceiros (hospedagem, e-mail).	B / A	Transferir	Prazos de atendimento acordados em contrato com os provedores.
R14	Pedidos novos fora do escopo durante o projeto.	M / M	Evitar	Controle de mudanças: cada pedido é avaliado e, se aprovado, entra por escopo e prazo acordados.

12. Premissas, restrições e pontos em aberto

Objetivo desta seção: registrar as condições assumidas, os limites do projeto e o que ainda não está definido, para que todos partam do mesmo entendimento.

Premissas (o que consideramos verdadeiro)

- O processo desenhado representa o que foi demonstrado nas reuniões de 29 e 30/09/2026.
- O Itaú indicará validadores com autoridade para decidir.
- Os cadastros e as regras de pontuação serão fornecidos até 26/11/2026.
- O Itaú liberará acessos e ambientes a tempo.
- O Itaú fornecerá o login corporativo e o serviço de e-mail.
- As datas e as metas deste documento são propostas até a aprovação do Itaú.

Restrições (o que limita o projeto)

- Prazo final de 29/01/2027.
- Fim de ano com menos pessoas disponíveis.
- Itens fora do escopo desta entrega: módulo de atendimento técnico, detecção automática por câmeras e integração com sistemas de terceiros (V23).
- Itens que só entram se o Itaú confirmar e o prazo permitir: módulo de ocorrências por pessoa (documentação de terceiros) e indicadores comparáveis avançados (V12, V19).

Pontos em aberto

Todos os pontos em aberto estão na seção 13, numerados de V1 a V31. Eles definem o fluxo final.

13. Pontos para validação do Itaú

Objetivo desta seção: listar as decisões e regras que o Itaú precisa confirmar. Para cada ponto, mostramos a proposta da Stefanini.

Como responder: escreva Concordo, Ajustar (com o ajuste) ou Outra decisão na última coluna. **Prazo: 19/11/2026.**

#	Tema	Proposta da Stefanini	O que o Itaú precisa confirmar	Passos	Resposta do Itaú
V1	Responsável pelo acompanhamento	Cada ocorrência tem um responsável interno nomeado na abertura (quem abriu, por padrão) e um substituto para ausências.	Quem é o responsável formal e quem assume na ausência?	14	
V2	Critério de encerramento	O encerramento exige status final, motivo e evidência. A lista de evidências aceitas varia por tipo de ocorrência.	Quais evidências e condições provam que cada tipo de ocorrência foi tratada?	18	
V3	Lista de status e efeito na medição	Status propostos: Aberta, Em tratamento, Finalizada e Aberta indevidamente. Só Finalizada entra na pontuação. Aberta indevidamente nunca pontua.	Confirmar os status, quem pode usar cada um e o efeito de cada um na medição.	14, 16, 18, 19	
V4	Prazo para tratar e encerrar	O sistema aceita um prazo por categoria/SLA. Ocorrência vencida gera alerta ao responsável e aparece no painel.	Existe prazo por categoria/SLA? O atraso gera consequência (por exemplo, pontuação)?	14, 17	
V5	Canal de resposta do fornecedor	O fornecedor responde por e-mail. O responsável interno registra o retorno na ocorrência. Alternativa: link seguro para o fornecedor responder direto no sistema.	Qual é o canal oficial de resposta, o conteúdo mínimo esperado e se o fornecedor pode ter acesso ao sistema?	13, 14	
V6	Comprovação de entrega do e-mail	O sistema reenvia até 3 vezes (intervalos de 5, 15 e 60 minutos) e alerta o responsável se a entrega não for confirmada.	Confirmar o número de tentativas, os intervalos e a contingência manual.	10 a 12	
V7	Lista oficial de destinatários	Cada fornecedor tem destinatários principais e em cópia, por categoria e contrato. O Itaú indica quem atualiza a lista.	Fornecer a lista oficial e definir quem a mantém e com que frequência.	10	
V8	Correção de ocorrência aberta com erro	Ao corrigir fornecedor, destinatário ou item, o sistema oferece reenviar a notificação. Se o fornecedor mudar, o anterior recebe um aviso de desconsideração.	Aprovar este procedimento e o texto do aviso de desconsideração.	15, 16	

#	Tema	Proposta da Stefanini	O que o Itaú precisa confirmar	Passos	Resposta do Itaú
V9	Matriz de classificação	O sistema oferece a matriz de severidade como lista fechada (por exemplo, leve, moderada, grave e gravíssima) por categoria e fornecedor.	Fornecer a matriz completa (disponibilidade, operacional e comportamental) e os valores de “plano de ação”.	8	
V10	Fluxo de acesso	Pedido feito no próprio sistema, aprovação pelo gestor, perfis Operador, Analista e Gestor, e revisão periódica dos acessos.	Confirmar formulário, aprovadores, prazo de atendimento, periodicidade da revisão e regra de revogação.	1 a 3	
V11	Quem pode editar e encerrar	Só o responsável da ocorrência (ou o gestor) edita e encerra. Todo caso fora disso exige justificativa registrada.	Confirmar se outros perfis podem editar ou encerrar ocorrências de terceiros e em quais exceções.	14 a 18	
V12	Dados pessoais de terceiros	Dados pessoais ficam em campos próprios e protegidos, com o mínimo necessário. A observação livre não recebe documentos de pessoas.	Quais dados de terceiros podem constar na ocorrência, com quais controles e por quanto tempo?	8	
V13	Fonte oficial dos cadastros	O novo sistema lê, sempre que possível, o cadastro oficial de RGI, polos, postos, fornecedores e contratos, sem tabelas paralelas.	Indicar o sistema oficial de cada cadastro e o responsável por ele.	5, 6	
V14	Governança dos cadastros	Analista cria e altera itens. Gestor ativa e inativa. Mudanças ficam registradas.	Definir quem cria, altera, ativa e inativa cada cadastro e como aprova mudanças.	6, 7	
V15	Carga em lote de cadastros	O novo sistema inclui carga em lote com modelo de planilha, validação prévia e relatório de erros.	Confirmar se a carga em lote faz parte do escopo de entrega e o formato do modelo.	7	
V16	Data de corte e competência	Corte mensal em data fixa. Cada ocorrência pontua na competência do mês de seu encerramento.	Confirmar a data de corte, a regra de competência e o tratamento de ocorrência encerrada após o corte.	19	
V17	Tabela de pontuação	Pesos, faixas, ações correspondentes e vigência ficam configurados por contrato, sem alteração de código.	Fornecer a tabela vigente de cada contrato e indicar diferenças entre contratos.	20	
V18	Ocorrências abertas no fechamento	No fechamento, o sistema lista as ocorrências ainda abertas do período para a Gestão de Serviços. Elas não pontuam até serem finalizadas.	Confirmar que só ocorrências finalizadas pontuam e se casos abertos há muito tempo devem ter tratamento especial.	19, 21	
V19	Indicadores comparáveis	Além do total, o quadro mostra ocorrências por posto, por efetivo e por criticidade.	Escolher quais comparações a Gestão de Serviços quer ver.	20, 21	

#	Tema	Proposta da Stefanini	O que o Itaú precisa confirmar	Passos	Resposta do Itaú
V20	Alçadas das ações de gestão	O sistema registra quem aprovou cada ação (orientação, advertência, ajuste, escalonamento, rescisão).	Confirmar quem aprova cada tipo de ação e quais evidências são exigidas.	23	
V21	Retenção e histórico	O sistema guarda ocorrências, logs e e-mails pelo prazo definido pelo Itaú e arquiva o restante.	Informar o prazo de retenção de ocorrências, logs, relatórios e e-mails.	Todos	
V22	Sustentação após a entrega	A Stefanini monitora falhas de envio e atende incidentes. Prazos de atendimento serão acordados.	Confirmar o responsável pelo produto no Itaú, os horários de atendimento e os prazos de resposta.	12	
V23	Módulo de atendimento técnico	Não faz parte do novo sistema nesta entrega.	Confirmar que o módulo será descontinuado ou ficará fora do novo sistema.	—	
V24	Sessão e segurança	Sessão expira após 30 minutos sem uso, com aviso 5 minutos antes e salvamento automático do rascunho.	Confirmar o tempo de inatividade, o aviso e o salvamento temporário.	5, 8	
V25	Amostra real para validação	Três ocorrências reais (indisponibilidade, comportamento e documentação) percorrem o fluxo em homologação.	Indicar as três ocorrências e a pessoa que valida cada resultado.	Todos	
V26	Autenticação e e-mail corporativos	Login pelo acesso corporativo do Itaú. E-mails saem de um remetente oficial do Itaú.	Indicar o serviço de login, o serviço de e-mail e o contato técnico responsável por cada um.	3, 10	
V27	Hospedagem e ambientes	Ambientes de desenvolvimento, homologação e produção seguem as regras do Itaú.	Informar onde o sistema será hospedado e quais requisitos de infraestrutura e de segurança se aplicam.	—	
V28	Papel da Stefanini na operação	A Stefanini faz a sustentação (monitoramento, correções, evolução). A operação diária do processo fica com o Itaú.	Confirmar esta divisão de responsabilidades e o horário de atendimento.	12	
V29	Migração do histórico	Migrar cadastros e ocorrências dos últimos 24 meses, mais todas as ocorrências abertas no dia do corte.	Confirmar quanto histórico migrar e como tratar ocorrências abertas na data do corte.	Migração	
V30	Critério de desligamento do Thanos	O Thanos passa a somente consulta no corte e é desligado em 29/01/2027 após o aceite do Itaú.	Confirmar o que significa “conclusão em 29/01/2027” (entrada em produção ou desligamento) e o critério de aceite.	Migração	

#	Tema	Proposta da Stefanini	O que o Itaú precisa confirmar	Passos	Resposta do Itaú
V31	Contestação do fornecedor	O fornecedor pode contestar uma ocorrência. A contestação fica registrada e o responsável decide antes do encerramento.	Existe processo de contestação hoje? Quem decide e em que prazo?	13, 14	

14. Validação e aceite

Objetivo desta seção: registrar a decisão do Itaú sobre o fluxo apresentado neste documento.

Ao assinar, o Itaú declara que leu as seções 4 e 5 e que o fluxo representa o processo desejado, com as ressalvas indicadas abaixo e as respostas aos pontos da seção 13.

Decisão

☐ Aprovado ☐ Aprovado com ressalvas ☐ Não aprovado

Ressalvas

Assinaturas

Itaú	Responsável 1	Responsável 2
Nome		
Cargo / área		
Assinatura		
Data		

Stefanini	Responsável 1	Responsável 2
Nome		
Cargo / área		
Assinatura		
Data		
